

Obr.: IP 001/21 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO
 Tipo de Inversión: INGRESOS PROPIOS 2021
 Programa: UJ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
 Subprograma: 01.03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS
 Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: IP 001/21
 Contratista: Ing. Ángel de Jesús Romíz Guardado
 Inicio Real: sábado, 13 de febrero de 2021
 Fin Vigente: sábado, 7 de agosto de 2021
 Fin Real: sábado, 7 de agosto de 2021

Días de Obra: 175
 Monto Contratado: \$ 199,990.00
 Monto Ejercido: \$ 199,990.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2021	33.41%	35.00%	0.0%
2	01/03/2021	34.78%	37.00%	0.0%
3	15/03/2021	36.15%	38.00%	0.0%
4	29/03/2021	42.00%	40.00%	0.0%
5	12/04/2021	43.37%	44.00%	0.0%
6	26/04/2021	44.74%	45.00%	0.0%
7	10/05/2021	46.11%	47.00%	0.0%
8	24/05/2021	50.00%	50.50%	0.0%
9	07/06/2021	51.37%	52.00%	0.0%
10	21/06/2021	52.74%	54.00%	0.0%
11	05/07/2021	53.20%	55.00%	0.0%
12	19/07/2021	49.23%	72.33%	0.0%
13	02/08/2021	84.00%	88.11%	0.0%
14	16/08/2021	100.00%	100.00%	0.0%
15	30/08/2021	100.00%	100.00%	0.0%
16	13/09/2021	100.00%	100.00%	0.0%
17	27/09/2021	100.00%	100.00%	0.0%
18	11/10/2021	100.00%	100.00%	0.0%
19	25/10/2021	100.00%	100.00%	0.0%
20	08/11/2021	100.00%	100.00%	100.0%

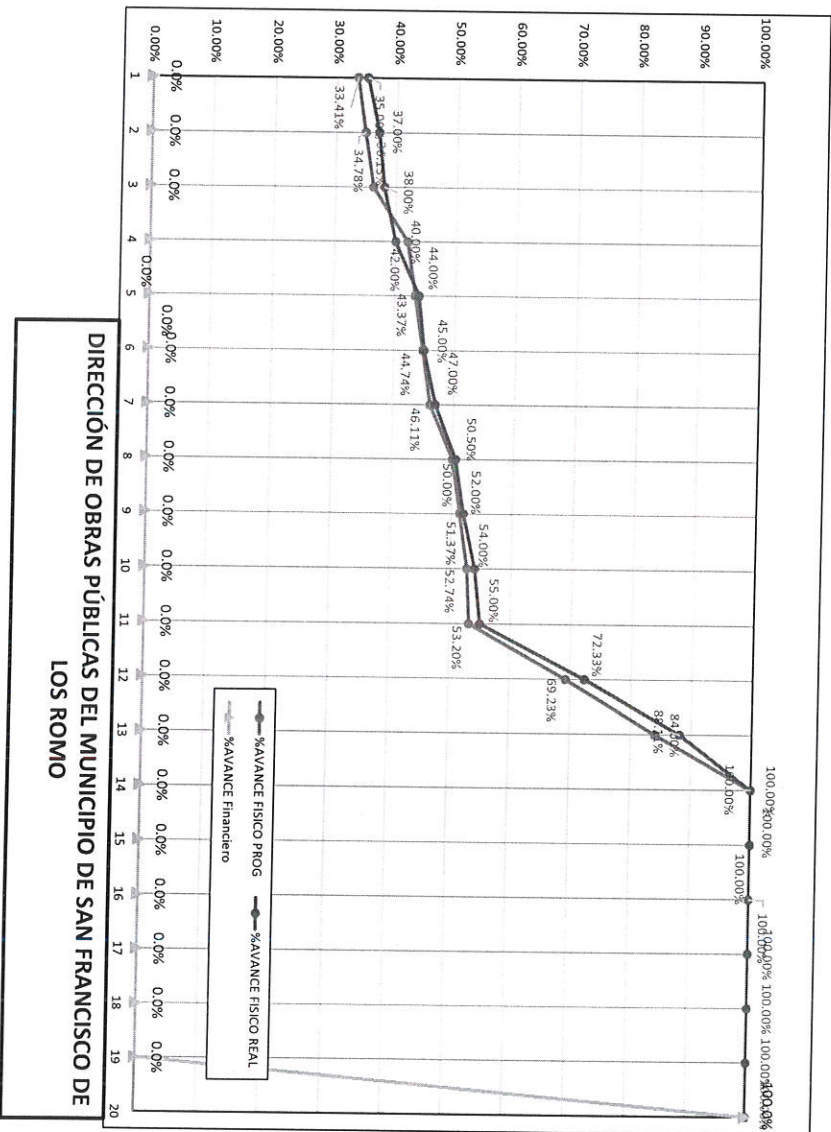

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
