

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 002/21 PERITO RESPONSABLE DE: 22 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE REFERENCIA

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS, REMANANTE DEL EJERCICIO 2019

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Subprograma: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: IP 002/21

Contratista: PROYECTOS SIGMA, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: jueves, 20 de mayo de 2021

Días de Obra: 220

Inicio Real: jueves, 20 de mayo de 2021


Monto Contratado: \$ 152,052.80

Fin Vigente: sábado, 25 de diciembre de 2021

Monto Ejercido: \$ 152,052.80

Fin Real: sábado, 25 de diciembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/05/2021	2.73%	3.00%	0.0%
2	07/06/2021	6.84%	7.00%	0.0%
3	21/06/2021	8.80%	9.00%	0.0%
4	05/07/2021	12.55%	13.00%	0.0%
5	19/07/2021	16.36%	18.00%	0.0%
6	02/08/2021	23.96%	25.00%	0.0%
7	16/08/2021	28.10%	30.00%	0.0%
8	30/08/2021	30.45%	33.00%	0.0%
9	13/09/2021	32.36%	35.00%	0.0%
10	27/09/2021	38.01%	40.00%	0.0%
11	11/10/2021	42.69%	44.12%	0.0%
12	25/10/2021	48.16%	50.15%	0.0%
13	08/11/2021	53.82%	56.78%	50.0%
14	22/11/2021	64.95%	68.35%	50.0%
15	06/12/2021	79.50%	81.42%	50.0%
16	20/12/2021	94.05%	96.78%	50.0%
17	03/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%

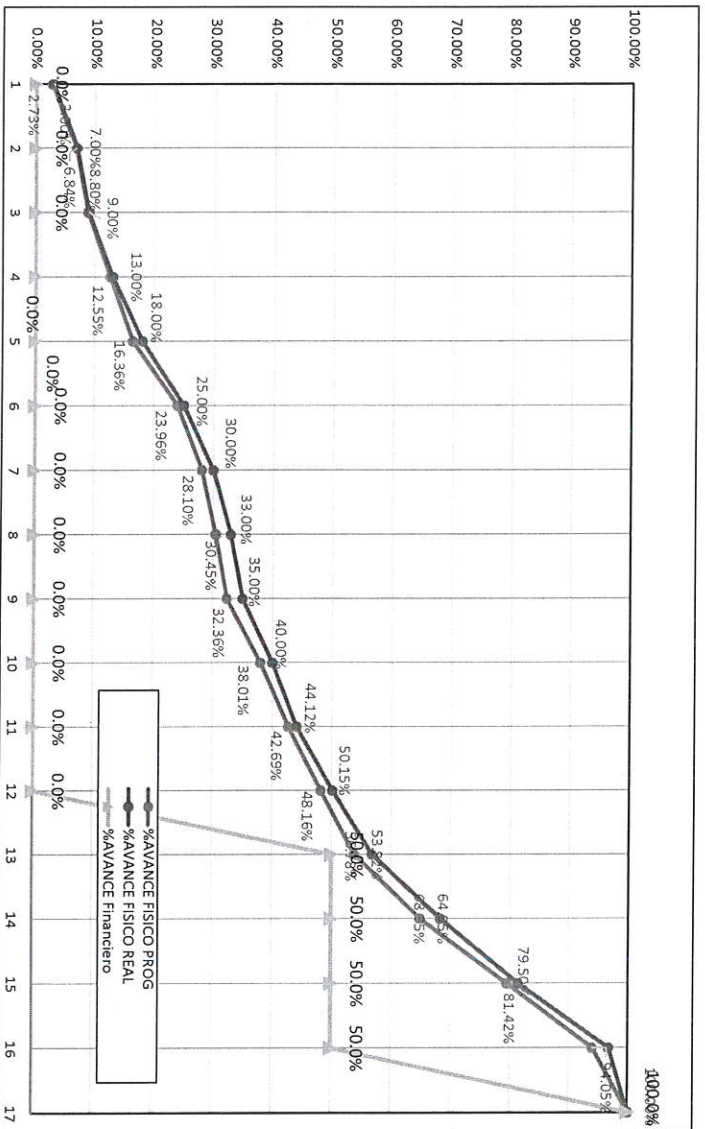

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
