

Obra: IP 003/21 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EZQUIO RAMÍREZ NORTE Y CALLE PERPENDICULAR A LÁZARO CARMENAS, LORETTITO, SFR.

Ubicación: LORETTITO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2021

Programa: SG ELECTRIFICACION


Subprograma: 02 b) RURAL - AMPLIACION

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Contrato: IP 003/21  
 Contratista: ECOSTRUCIONES, S.A. de C.V.  
 Inicio Vigente: miércoles, 3 de noviembre de 2021  
 Inicio Real: miércoles, 3 de noviembre de 2021  
 Fin Vigente: jueves, 2 de diciembre de 2021  
 Fin Real: jueves, 2 de diciembre de 2021  
 Monto Contratado: \$ 480,000.00  
 Monto Ejecutado: \$ 480,000.00  
 Días de Obra: 30 días

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/11/2021	32.11%	35.12%	50.0%
2	15/11/2021	42.22%	45.61%	50.0%
3	22/11/2021	55.72%	58.30%	50.0%
4	29/11/2021	77.66%	79.63%	72.0%
5	06/12/2021	100.00%	100.00%	72.0%
6	13/12/2021	100.00%	100.00%	100.0%

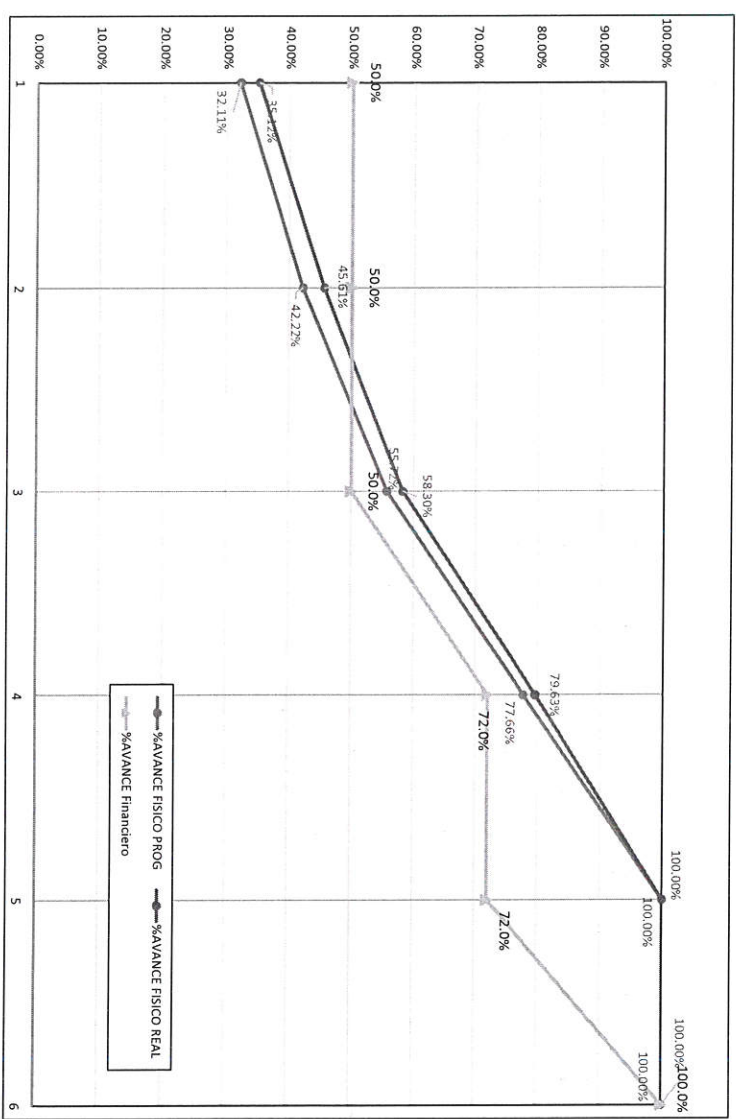

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
