

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 002/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE EL CARDONAL

Ubicación: FRACC. EL CARDONAL

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

Programa: SE URBANIZACIÓN

Subprograma: 07 d) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS - REHABILITACIÓN

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 002/2021

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 21 de mayo de 2021

Inicio Real: viernes, 21 de mayo de 2021

Fin Vigente: domingo, 4 de julio de 2021


Fin Real: domingo, 4 de julio de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 611,220.00

Monto Ejercido: \$ 611,220.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/05/2021	18.00%	20.00%	50.0%
2	31/05/2021	38.00%	40.00%	50.0%
3	07/06/2021	58.00%	60.00%	50.0%
4	14/06/2021	84.00%	85.00%	50.0%
5	21/06/2021	87.00%	89.00%	50.0%
6	28/06/2021	94.00%	94.00%	50.0%
7	05/07/2021	100.00%	100.00%	50.0%
8	12/07/2021	100.00%	100.00%	94.8%
9	19/07/2021	100.00%	100.00%	94.8%
10	26/07/2021	100.00%	100.00%	100.0%

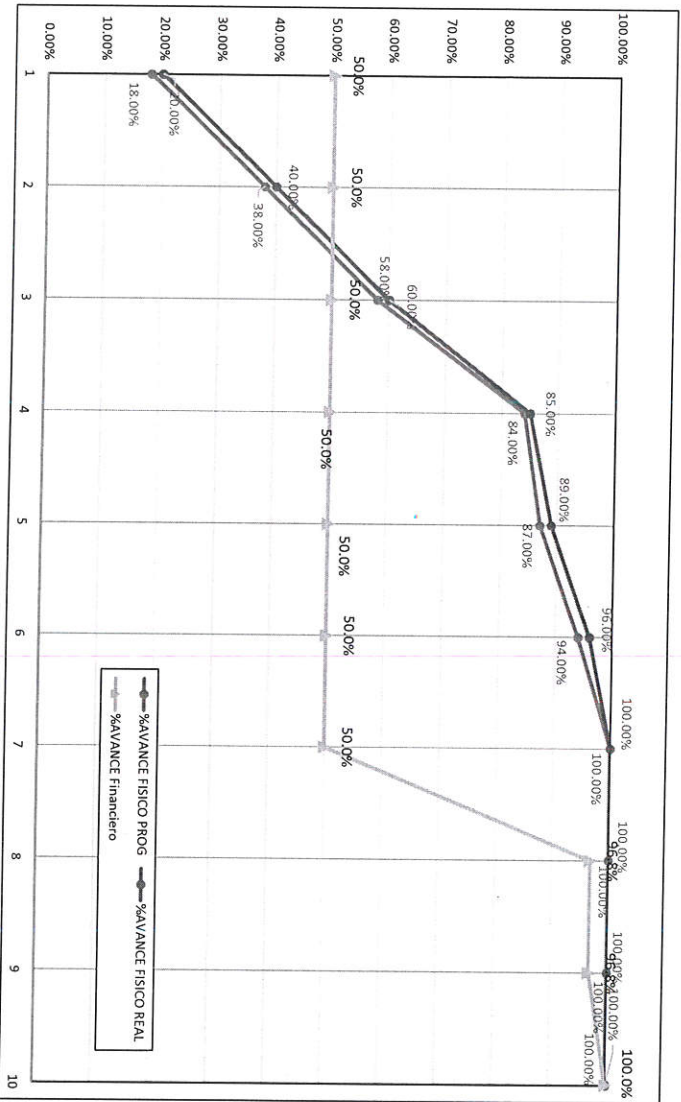

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
