

# GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 001/22 READECUACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2022

Programa: DA EDIFICIOS PUBLICOS

Subprograma: 01 REHABILITACION

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FR 001/2022

Contratista: C. I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez

Inicio Vigente: Lunes, 30 de mayo de 2022

Inicio Real: Lunes, 30 de mayo de 2022

Fin Vigente: Jueves, 28 de julio de 2022


Fin Real:

Días de Obra: 60 días

Monto Contratado: \$ 1,130,893.77

Monto Ejercido: \$ 1,130,893.77

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/05/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	13/06/2022	12.24%	13.40%	53.4%
3	27/06/2022	46.34%	47.30%	53.4%
4				
5				
6				
7				

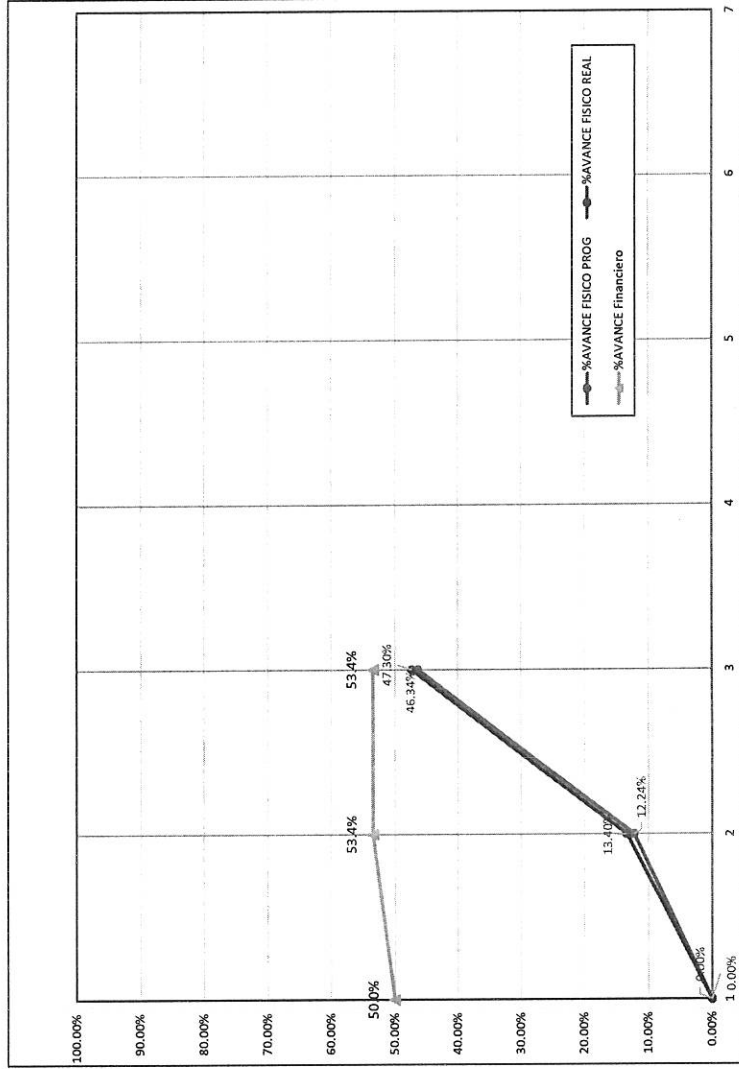

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
