

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, DELEGACIÓN PUERTRECITO DE LA VIRGEN

Ubicación: DELEGACIÓN PUERTRECITO DE LA VIRGEN

Contrato: PFR 001/2022

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: DA EDIFICIOS PUBLICOS

Subprograma: 03 CONTRUCCION

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Inicio Vigente: miércoles, 4 de mayo de 2022

Días de Obra: 90

Inicio Real: miércoles, 4 de mayo de 2022


Monto Contratado: \$ 1,608,797.14

Fin Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022

Monto Ejercido: \$ 1,608,797.14

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/05/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	18/05/2022	5.07%	5.90%	50.0%
3	01/06/2022	17.10%	18.20%	50.0%
4	15/06/2022	31.79%	32.12%	63.4%
5	29/06/2022	52.34%	53.11%	75.4%
6				
7				
8				
9				
10				

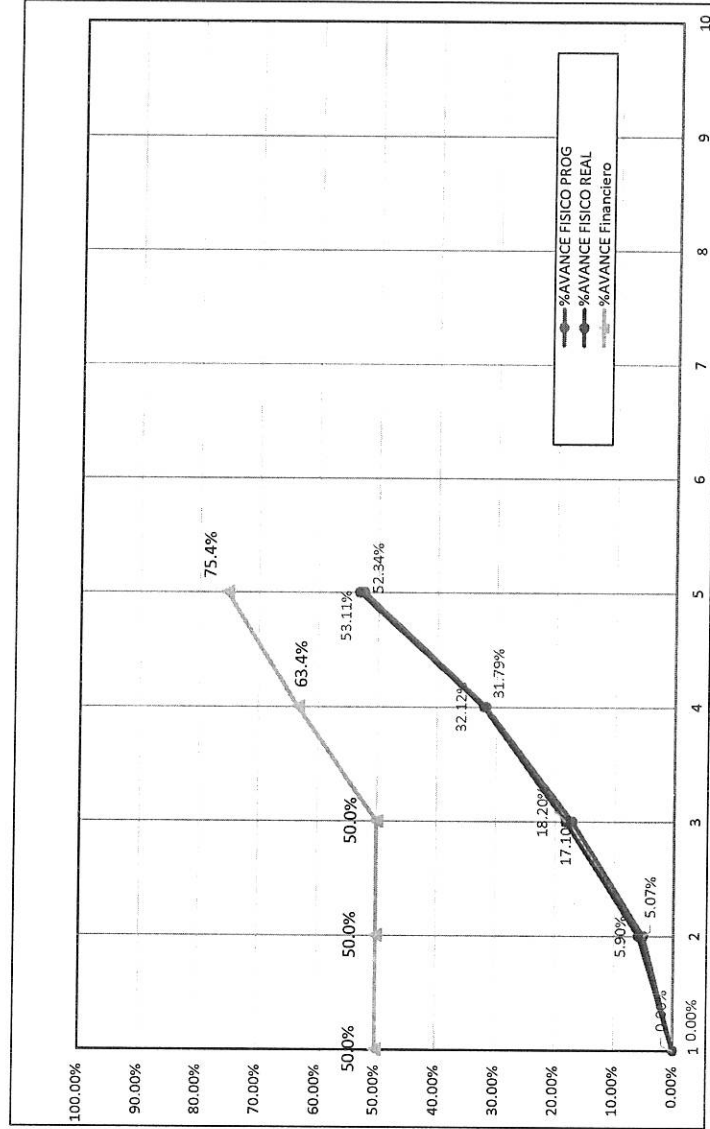

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
