

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ABUELO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PR SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 C/2022

Contratista: ELECTROSERVICIOS MEDHER S.A. DE CV.


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG. Inicio Vigente: jueves, 2 de junio de 2022 Días de Obra: 45

Subprograma: 03 SERVICIOS Inicio Real: jueves, 2 de junio de 2022 Monto Contratado: \$38,010.00

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES Fin Vigente: sábado, 16 de julio de 2022 Monto Ejercido: \$0.00

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	16/06/2022	47.00%	47.00%	0.0%
3	30/06/2022	62.00%	62.00%	0.0%
4				
5				

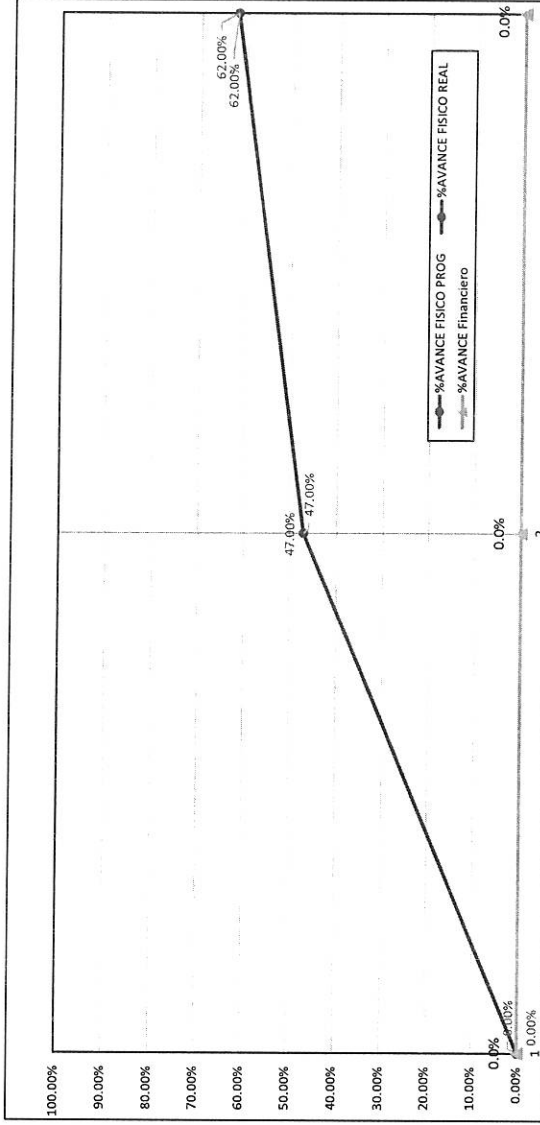

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
