

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE 5 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: IPR 001 A 2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021

Contrato: JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Inicio Vigente: miércoles, 6 de abril de 2022

Subprograma: 03 SERVICIOS

Fin Vigente: domingo, 2 de octubre de 2022

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA


Días de Obra: 180

Monto Contratado: \$ 38,010.30

Monto Ejercido: \$ 38,010.30

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/04/2022	10.00%	10.00%	0.0%
2	20/04/2022	31.90%	31.90%	0.0%
3	04/05/2022	37.32%	37.32%	0.0%
4	18/05/2022	38.00%	38.00%	0.0%
5	01/06/2022	42.00%	42.00%	0.0%
6	15/06/2022	49.32%	49.32%	0.0%
7	29/06/2022	50.65%	50.65%	0.0%
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

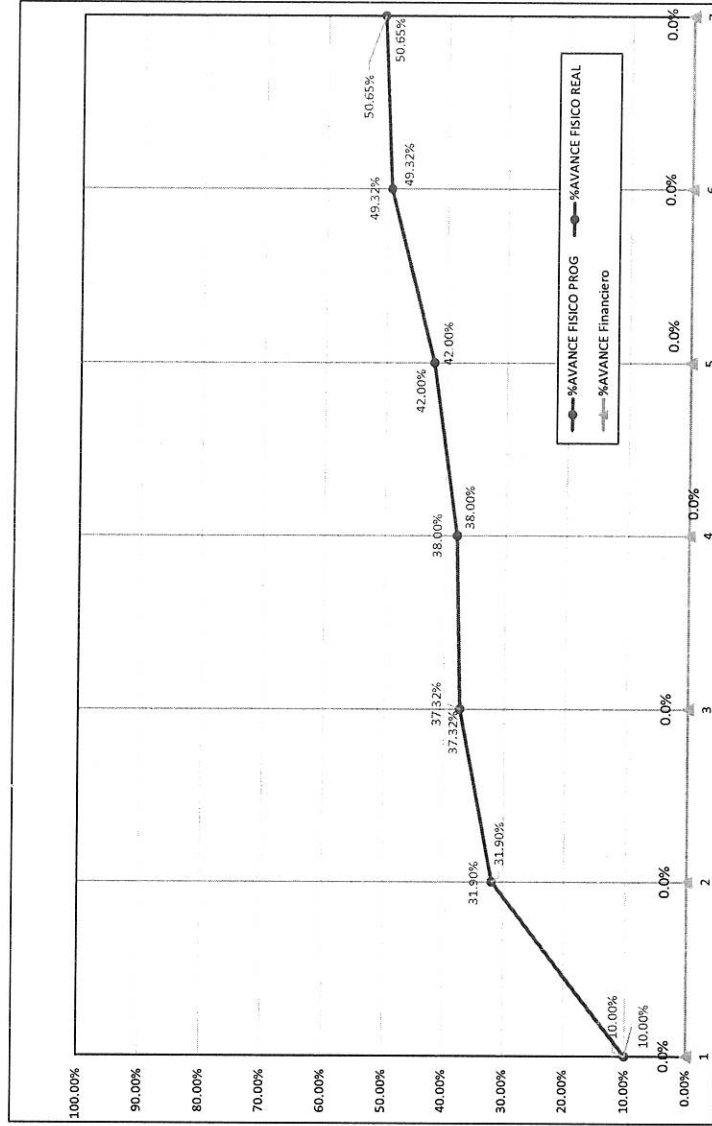

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
