

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ÁREAS A SUBTERRÁNEAS, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: IPR 001 B 2022

Contratista: ELECTROSERVICIOS MEDHER SA DE CV

Inicio Vigente: jueves, 7 de abril de 2022

Fin Vigente: lunes, 4 de julio de 2022


Fin Real:

Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$ 117,426.80

Monto Ejercido: \$ 117,426.80

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	21/04/2022	41.09%	41.09%	0.0%
3	05/05/2022	52.07%	52.07%	0.0%
4	19/05/2022	73.06%	73.06%	0.0%
5	02/06/2022	73.06%	73.06%	32.1%
6	16/06/2022	73.06%	73.06%	32.1%
7	30/06/2022	84.57%	84.57%	32.1%
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

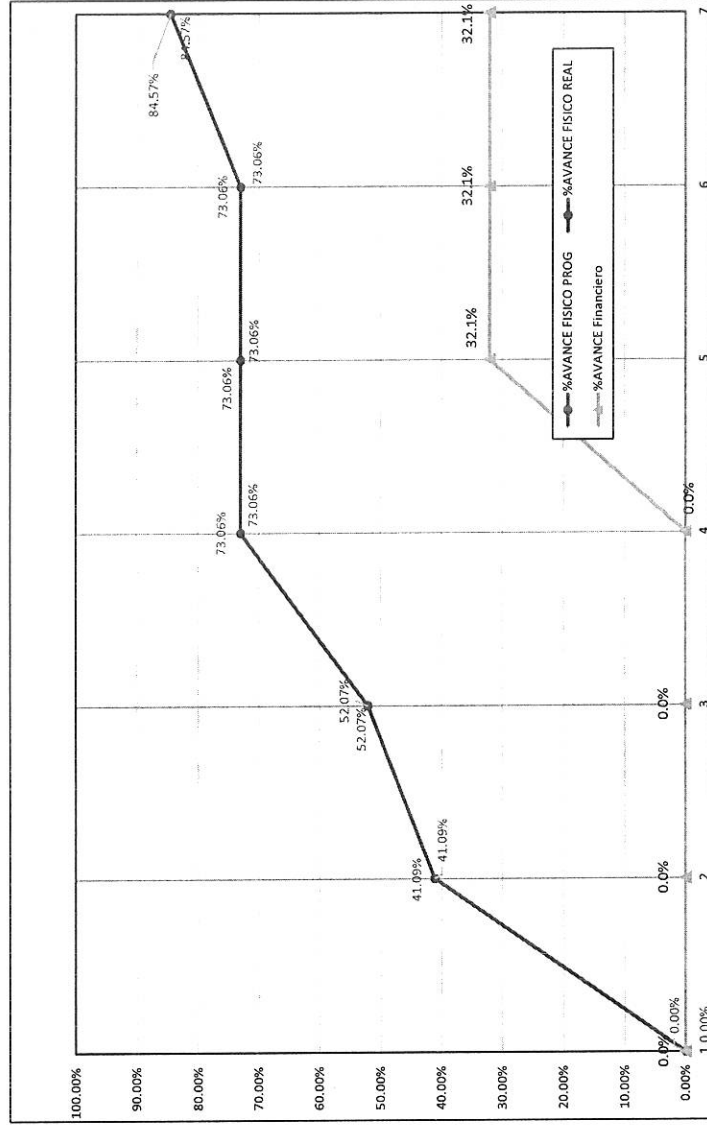

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
