


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, MECÁNICA DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: IPR 001 C 2022
 Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021
 Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
 Subprograma: 03 SERVICIOS
 Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: IPR 001 C 2022
 Contratista: I.C. ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO.
 Inicio Vigente: viernes, 22 de abril de 2022
 Días de Obra: 30
 Inicio Real: viernes, 22 de abril de 2022
 Fin Vigente: sábado, 21 de mayo de 2022
 Fin Real: sábado, 21 de mayo de 2022
 Monto Contratado: \$ 97,022.40
 Monto Ejercido: \$ 97,022.40

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2022	31.90%	31.90%	0.0%
3	20/05/2022	98.40%	98.40%	0.0%
4	03/06/2022	100.00%	100.00%	0.0%
5	17/06/2022	100.00%	100.00%	0.0%
6	01/07/2022	100.00%	100.00%	0.0%
7	15/07/2022	100.00%	100.00%	0.0%

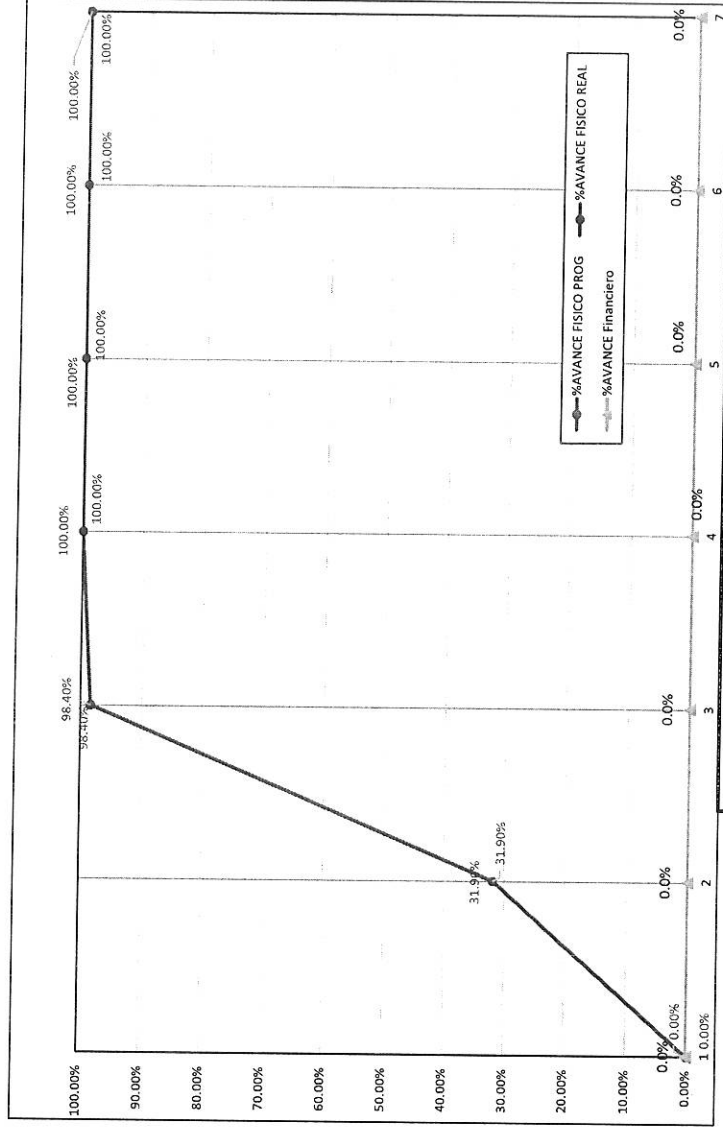

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
