

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residentes: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: IPR 001 D 2022

Contratista: CYNERGIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.S. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 22 de abril de 2022

Fin Vigente: lunes, 20 de junio de 2022


Fin Real: lunes, 20 de junio de 2022

Días de Obra: 180

Monto Contratado: \$ 277,682.39

Monto Ejercido: \$ 277,682.39

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2022	16.00%	16.00%	0.0%
3	20/05/2022	52.00%	52.00%	0.0%
4	03/06/2022	74.00%	74.00%	0.0%
5	17/06/2022	97.00%	97.00%	0.0%
6	30/06/2022	100.00%	100.00%	0.0%
7				

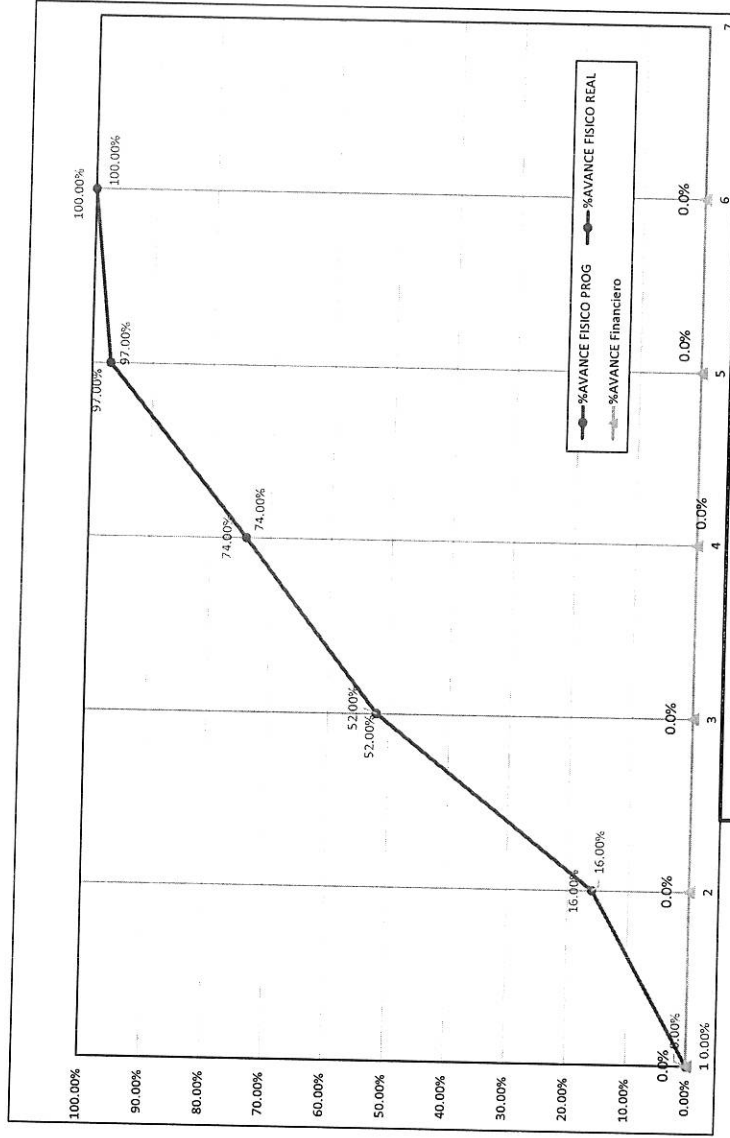

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
