

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA

Ubicación: COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FIS MDF 016/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

Programa: SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: viernes, 5 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: viernes, 5 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$866,794.98


Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: lunes, 3 de octubre de 2022

Monto Ejercido: \$866,794.98

Fin Real: lunes, 3 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/08/2022	1.63%	2.56%	50.0%
2	15/08/2022	8.68%	10.32%	50.0%
3	22/08/2022	18.57%	22.45%	50.0%
4	29/08/2022	28.46%	32.65%	50.0%
5	05/09/2022	38.35%	40.36%	50.0%
6	12/09/2022	48.24%	52.36%	50.0%
7	19/09/2022	58.79%	60.32%	50.0%
8	26/09/2022	79.54%	82.45%	50.0%
9	03/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%

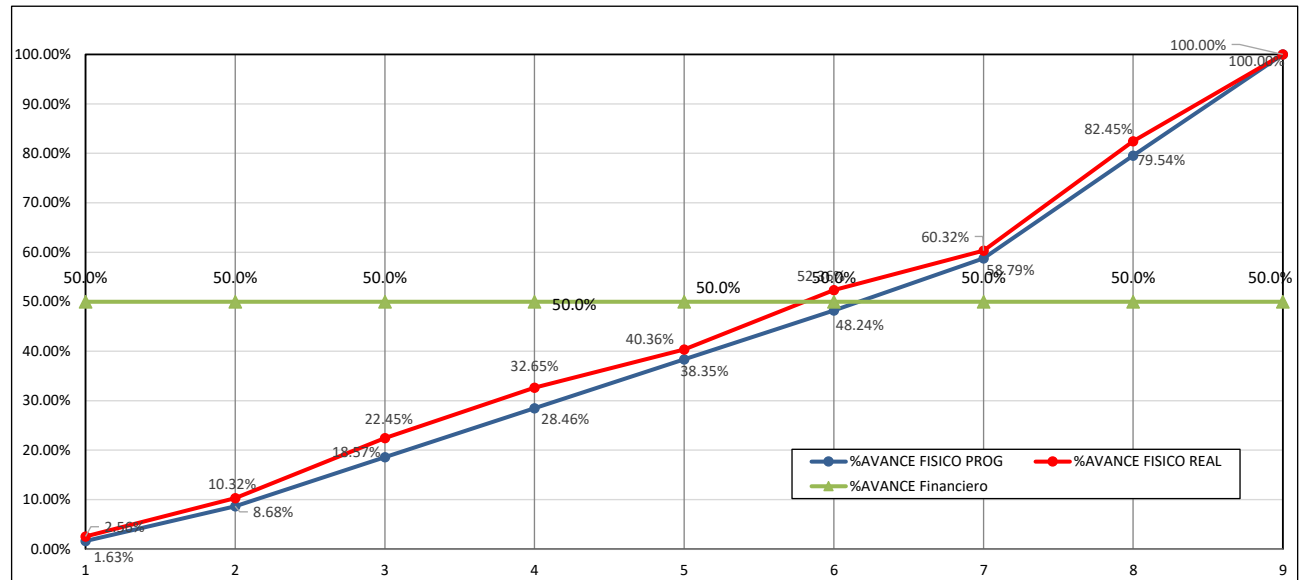

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
