

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

**Ubicación:** EX VIÑEDOS GUADALUPE

**Contrato:** FISMDF 023/2022

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

**Contratista:** C. I.C. Azael Jarib Córdova Huerta.

**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

**Inicio Vigente:** viernes, 5 de agosto de 2022

**Días de Obra:** 60 días

**Subprograma:** 01 CONCRETO

**Inicio Real:** viernes, 5 de agosto de 2022

**Monto Contratado:** \$1,524,195.64


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** lunes, 3 de octubre de 2022

**Monto Ejercido:** \$1,524,195.64

**Fin Real:** lunes, 3 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/08/2022	3.24%	5.65%	50.0%
2	15/08/2022	6.35%	9.46%	50.0%
3	22/08/2022	7.44%	9.85%	50.0%
4	29/08/2022	8.43%	10.65%	50.0%
5	05/09/2022	26.40%	28.65%	79.3%
6	12/09/2022	44.36%	46.87%	79.3%
7	19/09/2022	62.33%	64.87%	79.3%
8	26/09/2022	80.73%	83.49%	79.3%
9	03/10/2022	100.00%	100.00%	96.9%

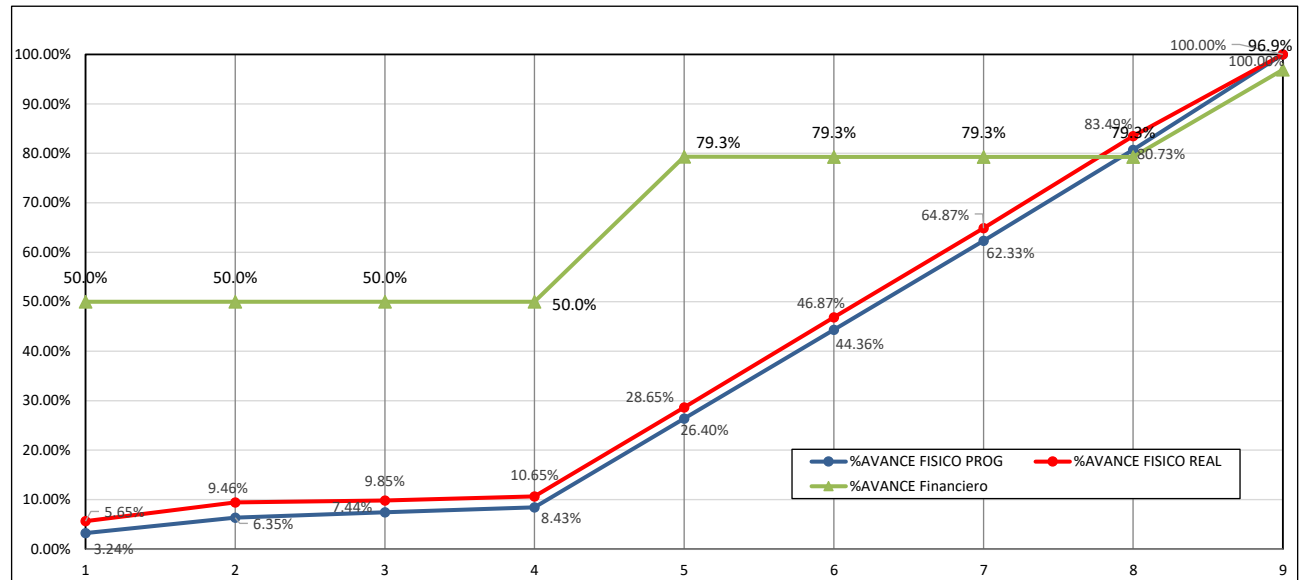

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
