

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 028/2022 REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÁZARO CARDENAS.

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GOMEZ

Contrato: FIS MDF 028/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V.

Programa: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES,

Inicio Vigente: viernes, 2 de septiembre de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: viernes, 2 de septiembre de 2022

Monto Contratado: \$869,229.03


Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: lunes, 31 de octubre de 2022

Monto Ejercido: \$869,229.03

Fin Real: lunes, 31 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/09/2022	1.32%	3.54%	50.0%
2	12/09/2022	23.69%	25.46%	50.0%
3	19/09/2022	33.94%	34.65%	50.0%
4	26/09/2022	45.19%	46.94%	50.0%
5	03/10/2022	64.05%	69.87%	50.0%
6	10/10/2022	76.03%	79.46%	50.0%
7	17/10/2022	87.06%	89.15%	50.0%
8	24/10/2022	98.11%	98.87%	50.0%
9	31/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%

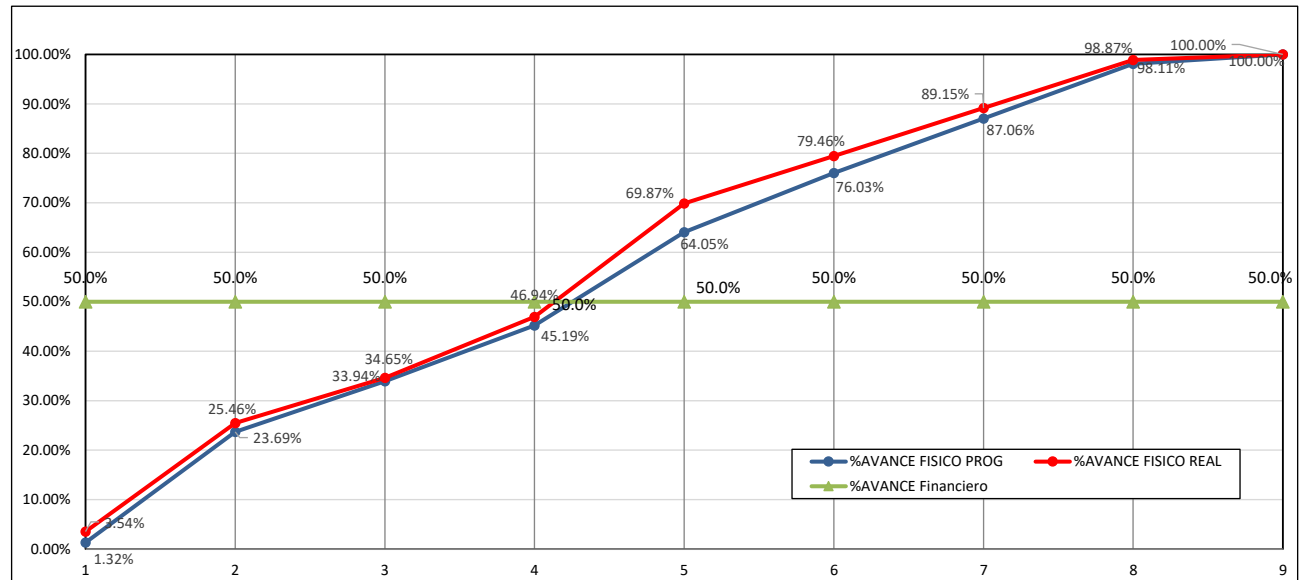

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
