


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA  
 FISMDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE  
 FISMDF 009/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIONARIOS Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA  
 FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN **Contrato:** FISMDF 006-008-009-026/2022  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 **Contratista:** GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** lunes, 1 de agosto de 2022 **Días de Obra:** 60 días  
**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** lunes, 1 de agosto de 2022 **Monto Contratado:** \$1,662,139.51  
**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA **Fin Vigente:** jueves, 29 de septiembre de 2022 **Monto Ejercido:** \$1,662,139.51  
**Fin Real:** jueves, 29 de septiembre de 2022

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 01/08/2022 | 0.00%               | 0.00%               | 50.0%              |
| 2      | 08/08/2022 | 12.40%              | 14.64%              | 50.0%              |
| 3      | 15/08/2022 | 34.42%              | 36.32%              | 50.0%              |
| 4      | 22/08/2022 | 51.23%              | 55.34%              | 50.0%              |
| 5      | 29/08/2022 | 67.84%              | 69.74%              | 50.0%              |
| 6      | 05/09/2022 | 71.35%              | 71.56%              | 50.0%              |
| 7      | 12/09/2022 | 75.32%              | 77.64%              | 50.0%              |
| 8      | 19/09/2022 | 81.58%              | 83.79%              | 50.0%              |
| 9      | 26/09/2022 | 96.32%              | 97.48%              | 50.0%              |
| 10     | 03/10/2022 | 100.00%             | 100.00%             | 50.0%              |

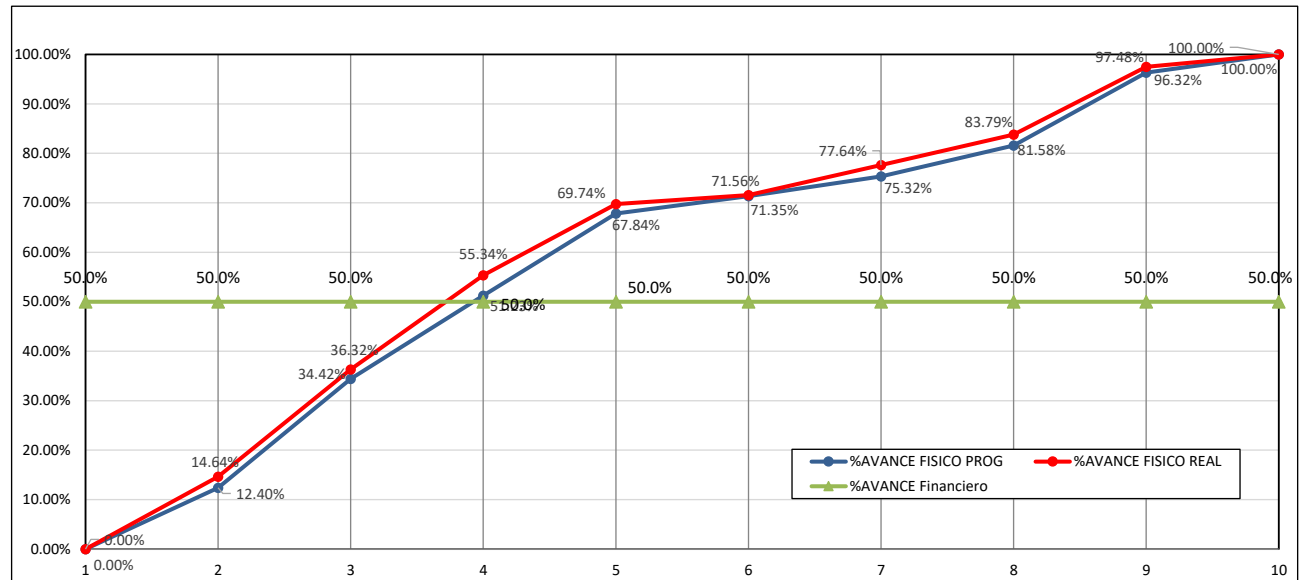

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
