

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 007/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
 FISMDF 020/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
 FISMDF 024/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FISMDF 007-020-024/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$1,517,435.49


Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022

Monto Ejercido: \$1,517,435.49

Fin Real: jueves, 29 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	08/08/2022	11.45%	13.87%	50.0%
3	15/08/2022	33.98%	35.49%	50.0%
4	22/08/2022	53.78%	59.20%	50.0%
5	29/08/2022	65.98%	66.17%	50.0%
6	05/09/2022	73.45%	76.20%	50.0%
7	12/09/2022	77.54%	80.19%	50.0%
8	19/09/2022	86.51%	87.16%	50.0%
9	26/09/2022	93.65%	95.64%	64.5%
10	03/10/2022	100.00%	100.00%	90.2%

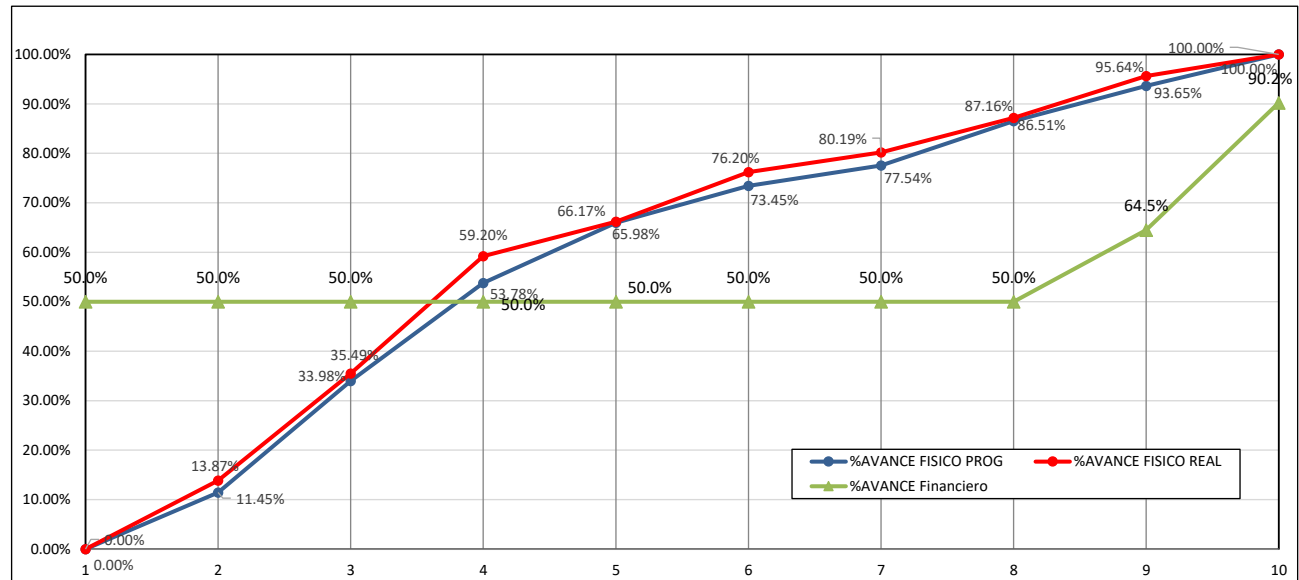

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
