

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 005/2022 REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL MONTE TRAMO CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ
 FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR
 FISMDF 013/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE JACARANDA Y PRIVADA JAIME NUNO
 FISMDF 014/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JACARANDA
 FISMDF 019/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL MONTE ENTRE LA CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ
 FISMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO
 FISMDF 022/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ

Contrato: FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: C. Jorge Armando Quezada Sotelo

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$1,100,888.93


Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022

Monto Ejercido: \$1,100,888.93

Fin Real: jueves, 29 de septiembre de 2022

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 01/08/2022 | 0.00% | 0.00% | 50.0% |
| 2 | 08/08/2022 | 12.16% | 13.65% | 50.0% |
| 3 | 15/08/2022 | 37.50% | 39.52% | 50.0% |
| 4 | 22/08/2022 | 44.65% | 45.30% | 50.0% |
| 5 | 29/08/2022 | 54.35% | 57.85% | 50.0% |
| 6 | 05/09/2022 | 78.68% | 80.12% | 50.0% |
| 7 | 12/09/2022 | 91.08% | 91.32% | 50.0% |
| 8 | 19/09/2022 | 95.12% | 96.36% | 50.0% |
| 9 | 26/09/2022 | 97.30% | 98.15% | 50.0% |
| 10 | 03/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 50.0% |

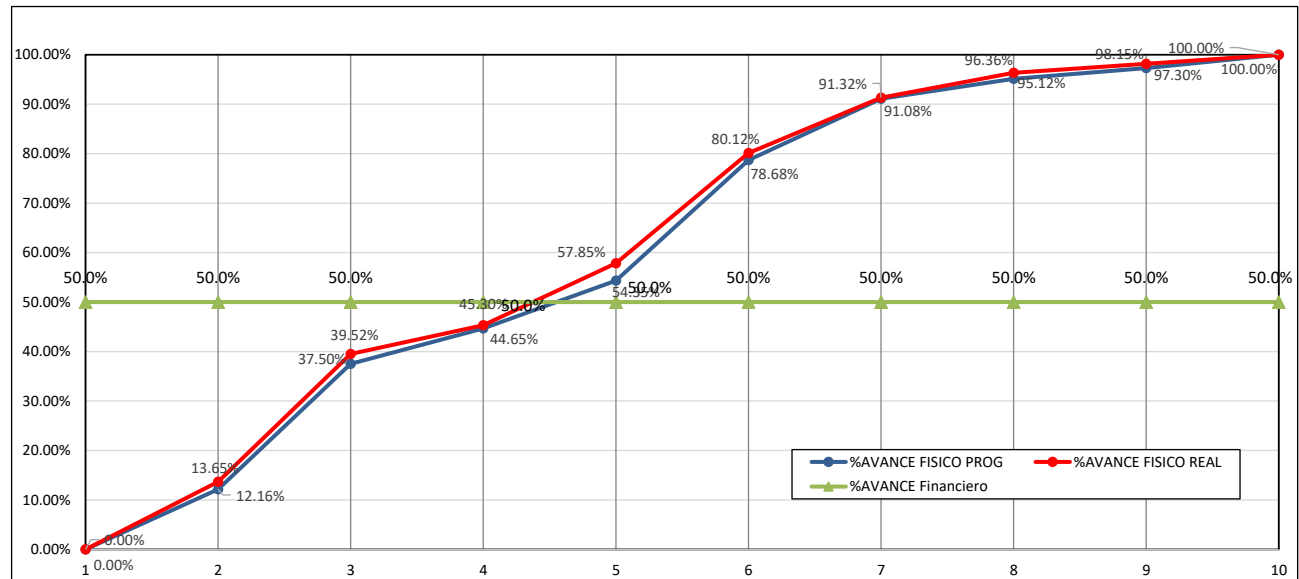

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
