

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN

**Ubicación:** DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN

**Contrato:** PFR 001/2022

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2021

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** DA EDIFICIOS PUBLICOS

**Inicio Vigente:** miércoles, 4 de mayo de 2022

**Días de Obra:** 90

**Subprograma:** 03 CONTRUCCION

**Inicio Real:** miércoles, 4 de mayo de 2022

**Monto Contratado:** \$ 1,674,000.00


**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** lunes, 1 de agosto de 2022

**Monto Ejercido:** \$ 1,674,000.00

**Fin Real:** lunes, 1 de agosto de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/05/2022	0.00%	0.00%	50.00%
2	09/05/2022	2.06%	2.50%	50.00%
3	16/05/2022	5.07%	5.90%	50.00%
4	23/05/2022	8.86%	9.10%	50.00%
6	30/05/2022	17.10%	18.20%	50.00%
6	06/06/2022	24.79%	26.50%	63.42%
7	13/06/2022	31.79%	32.12%	63.42%
8	20/06/2022	42.25%	44.00%	63.42%
9	27/06/2022	52.34%	53.11%	75.38%
10	04/07/2022	66.32%	68.00%	81.29%
11	11/07/2022	74.79%	76.50%	81.29%
12	18/07/2022	84.07%		
13	25/07/2022	95.27%		
14	01/08/2022	100.00%		

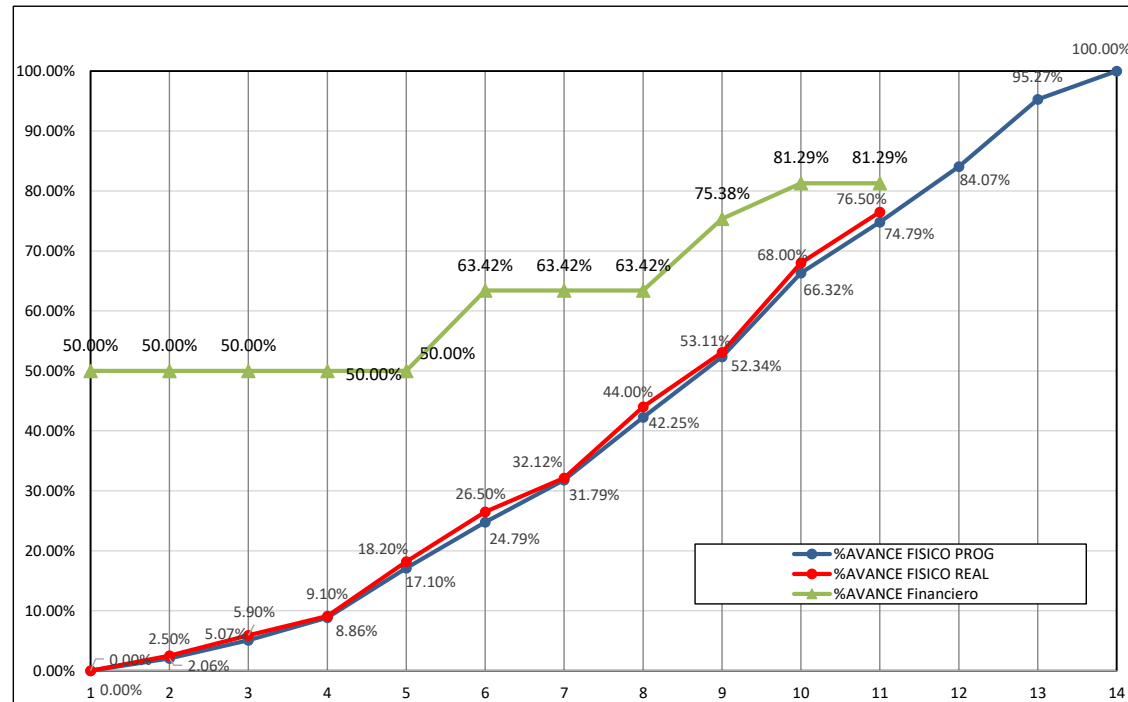

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
