

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 015/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO ENTRE LA AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN

**Ubicación:** COLONIA LOS CEDROS

**Contrato:** FIS MDF 015/2022

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

**Contratista:** ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

**Programa:** SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** miércoles, 17 de agosto de 2022

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** miércoles, 17 de agosto de 2022

**Monto Contratado:** \$541,331.26


**Residente:** ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** viernes, 30 de septiembre de 2022

**Monto Ejercido:** \$541,331.26

**Fin Real:** viernes, 30 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/08/2022	3.03%	5.65%	50.0%
2	27/08/2022	10.56%	13.56%	50.0%
3	03/09/2022	28.75%	36.00%	50.0%
4	10/09/2022	54.73%	60.00%	50.0%
5	17/09/2022	61.52%	77.20%	50.0%
6	24/09/2022	89.17%	95.00%	50.0%
7	01/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
8	08/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
9	15/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%

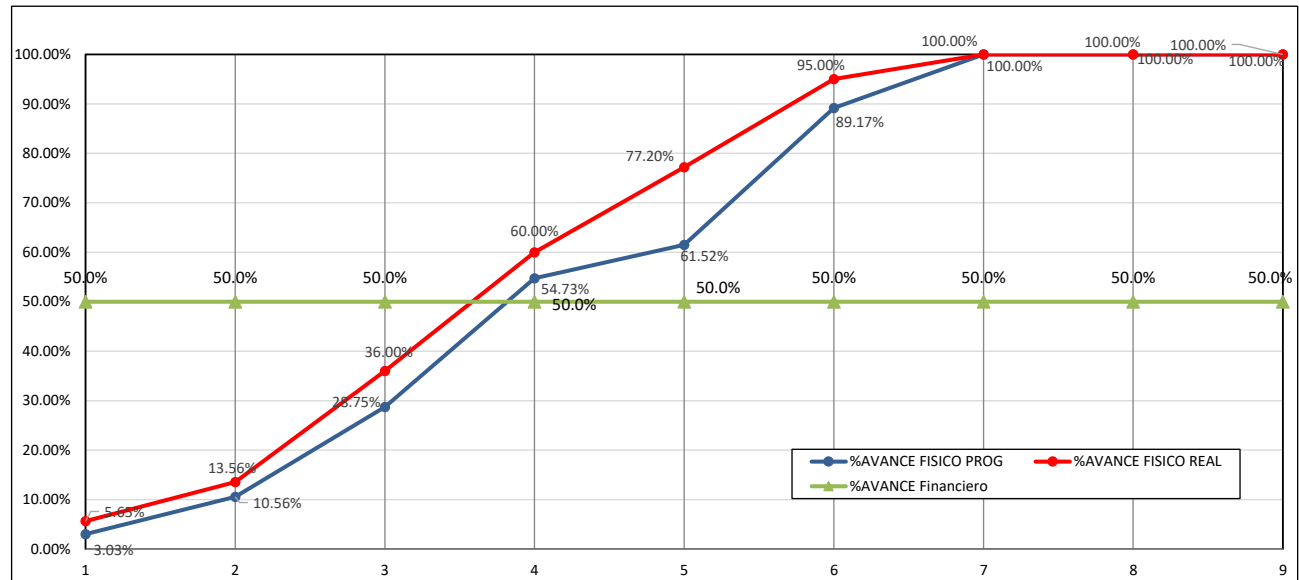

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
