

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 025/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO**

Ubicación: AMAPOLAS DEL RÍO

Contrato: FISMDF 025/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA

Programa: SE URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: jueves, 15 de septiembre de 2022

Días de Obra: 30 días

Subprograma: 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: jueves, 15 de septiembre de 2022

Monto Contratado: **\$383,692.53**


Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: viernes, 14 de octubre de 2022

Monto Ejercido: **\$383,692.53**

Fin Real: viernes, 14 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/09/2022	20.12%	20.65%	50.0%
2	25/09/2022	61.97%	63.54%	50.0%
3	02/10/2022	78.17%	79.59%	50.0%
4	09/10/2022	94.37%	96.78%	50.0%
5	16/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%

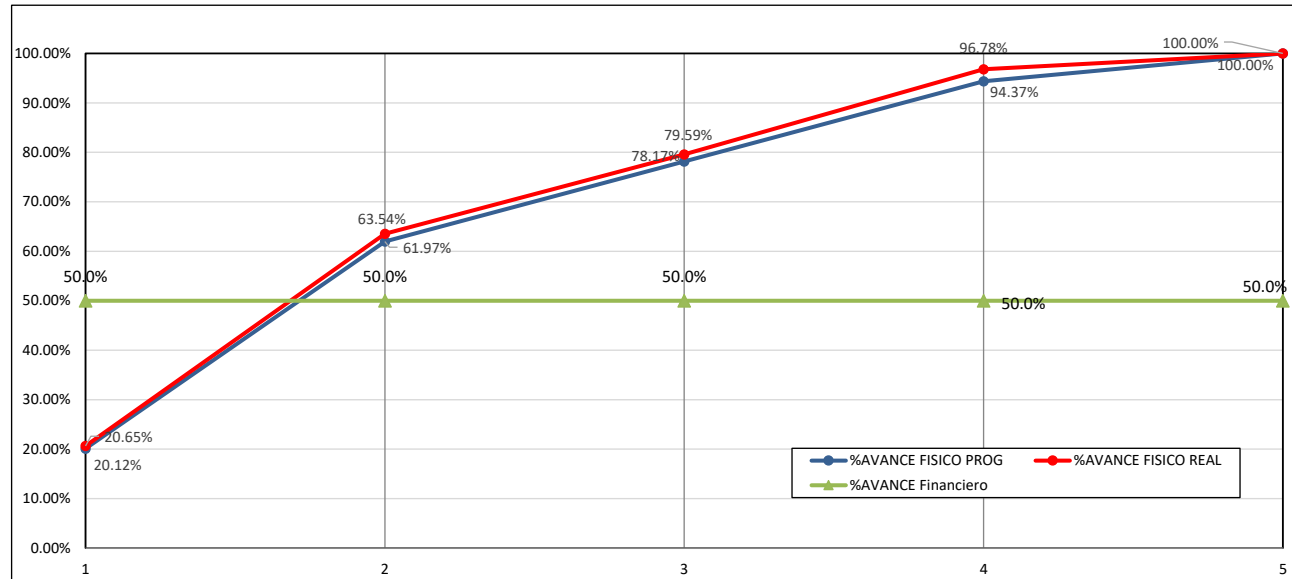

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
