


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL DIF, CABECERA MUNICIPAL, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PRUEBA DE PENETR	Contrato:	IP 001 A/2022
Ubicación:	CABECERA MUNICIPAL	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS 2022	Inicio Vigente:	sábado, 8 de enero de 2022
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.	Días de Obra:	5
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 8 de enero de 2022
Residente:	ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	miércoles, 12 de enero de 2022
		Monto Contratado:	\$46,110.00
		Monto Ejercido:	\$46,110.00
		Fin Real:	miércoles, 12 de enero de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/01/2022	75.00%	75.00%	0.0%
2	17/01/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	31/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%

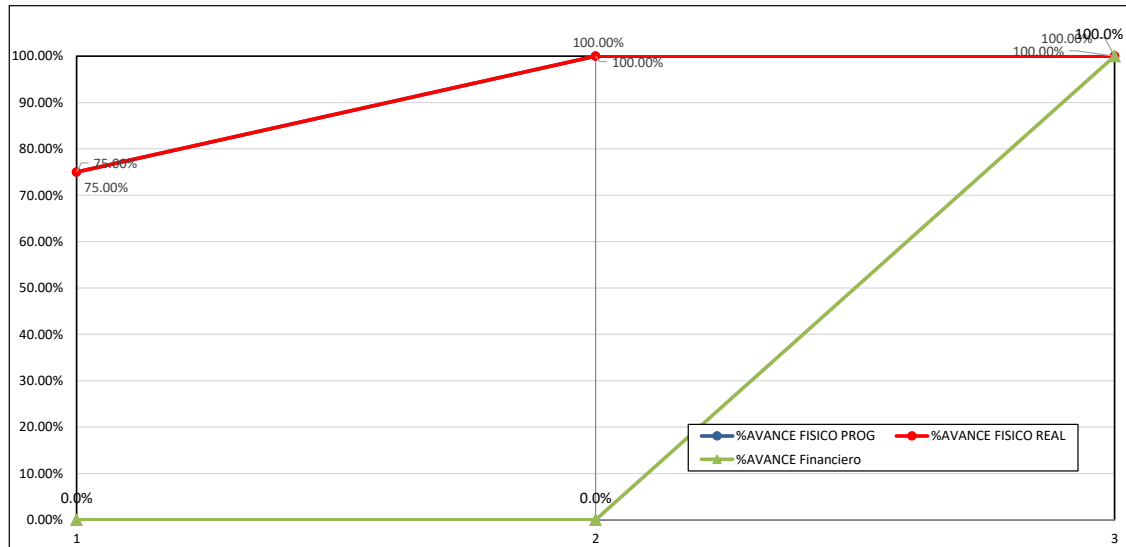

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
