


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ABUELO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PR	Contrato:	IP 001 B/2022
Ubicación:	PUERTECITO DE LA VIRGEN	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS 2022	Inicio Vigente:	jueves, 24 de febrero de 2022
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.	Días de Obra:	5
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	jueves, 24 de febrero de 2022
Residente:	ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	lunes, 28 de febrero de 2022
		Monto Contratado:	\$46,110.00
		Monto Ejercido:	\$46,110.00
		Fin Real:	lunes, 28 de febrero de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/02/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	28/02/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	14/03/2022	100.00%	100.00%	100.0%

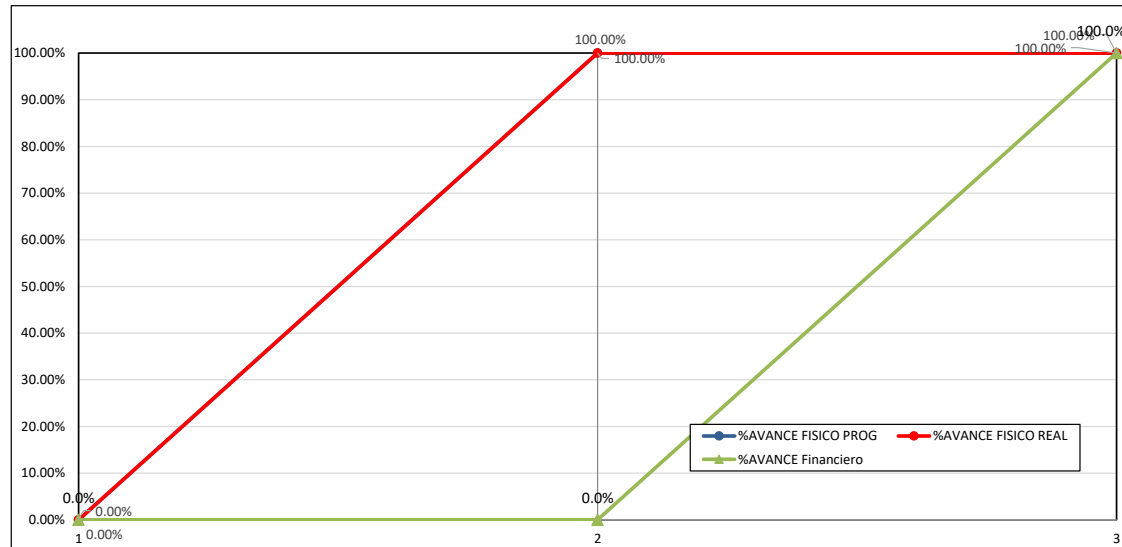

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
