


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ABUELO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B63 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PR				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IP 001 C/2022		
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS	Contratista:	ELECTROSERVICIOS MEDHER S.A. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.	Inicio Vigente:	jueves, 2 de junio de 2022	Días de Obra:	45
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	jueves, 2 de junio de 2022	Monto Contratado:	\$38,010.00
Residente:	ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	jueves, 28 de julio de 2022	Monto Ejercido:	\$38,010.00
		Fin Real:	jueves, 28 de julio de 2022		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	16/06/2022	42.00%	42.00%	0.0%
3	30/06/2022	51.22%	51.22%	0.0%
4	14/07/2022	60.83%	60.83%	0.0%
5	28/07/2022	63.83%	63.83%	0.0%
6	11/08/2022	100.00%	100.00%	0.0%

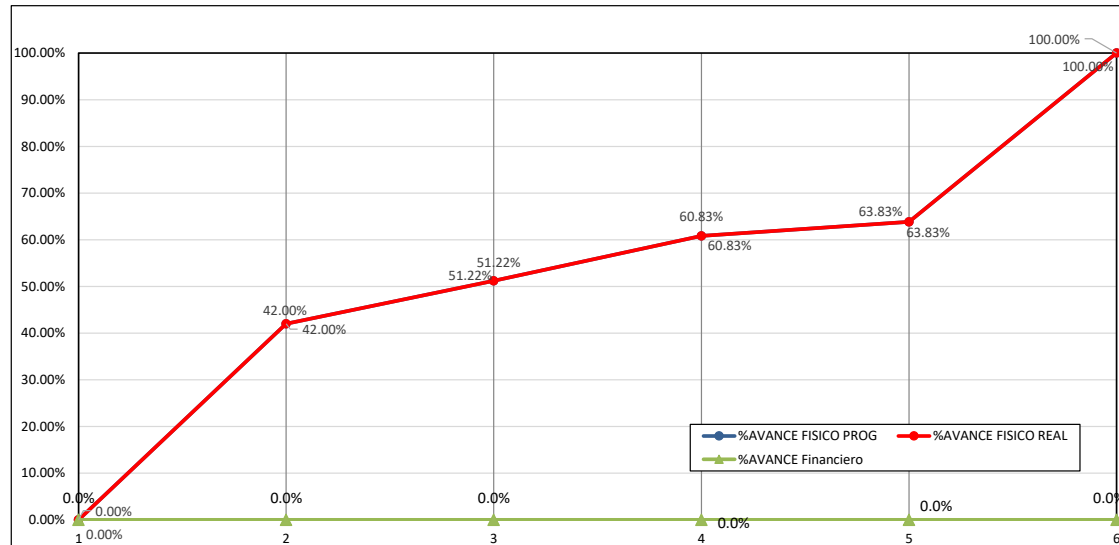

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
