


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IPR 001/2022 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE 5 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA)				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IPR 001 A 2022		
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021	Contratista:	JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	Inicio Vigente:	miércoles, 6 de abril de 2022	Días de Obra:	180
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 6 de abril de 2022	Monto Contratado:	\$ 38,010.30
Residente:	ING. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA	Fin Vigente:	domingo, 2 de octubre de 2022	Monto Ejercido:	\$ 38,010.30
		Fin Real:			

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	20/04/2022	15.30%	16.80%	0.0%
3	04/05/2022	20.60%	22.20%	0.0%
4	18/05/2022	25.90%	27.30%	0.0%
5	01/06/2022	31.20%	33.15%	0.0%
6	15/06/2022	36.50%	38.50%	0.0%
7	29/06/2022	43.10%	44.15%	0.0%
8	13/07/2022	44.40%	46.52%	0.0%
9	27/07/2022	49.80%	51.21%	0.0%
10	10/08/2022	56.40%	58.70%	0.0%
11	24/08/2022	61.70%	63.55%	0.0%
12	07/09/2022	67.00%	69.12%	0.0%
13	21/09/2022	83.60%	85.01%	70.4%
14	05/10/2022	100.00%	100.00%	70.4%

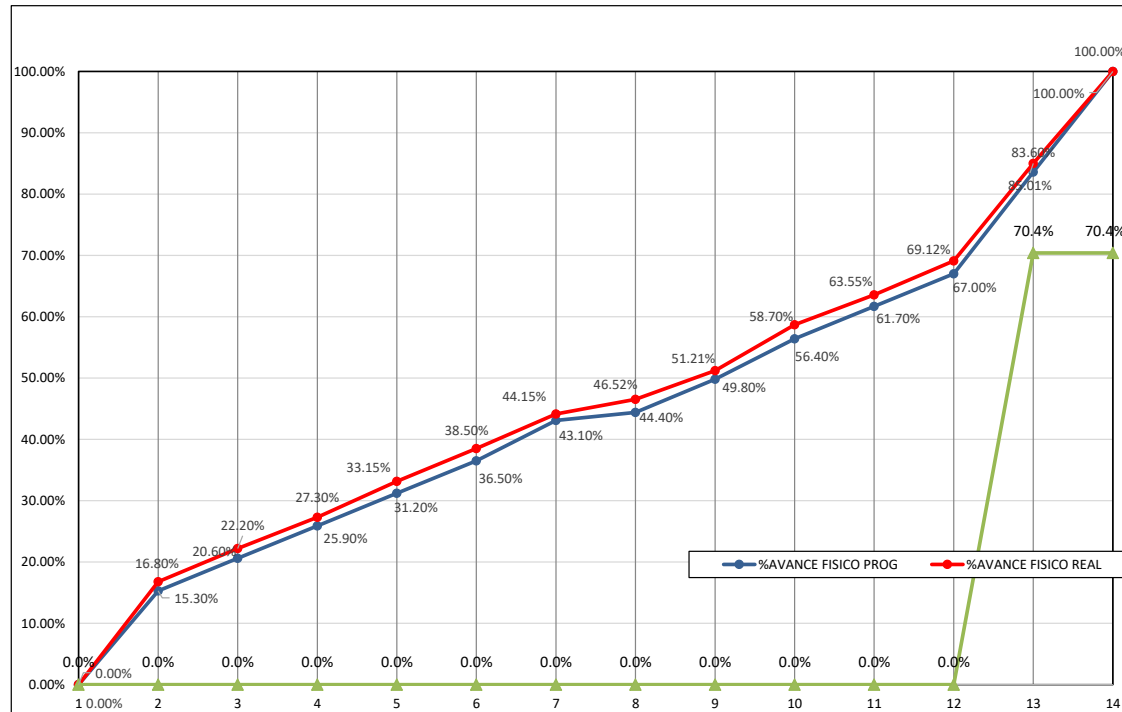

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
