


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AÉREAS A SUBTERRÁNEAS, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES	Contrato:	IPR 001 B 2022
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contratista:	ELECTROSERVICIOS MEDHER SA DE CV
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021	Inicio Vigente:	jueves, 7 de abril de 2022
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	Días de Obra:	60
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	jueves, 7 de abril de 2022
Residente:	ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	lunes, 4 de julio de 2022
		Monto Contratado:	\$ 117,426.80
		Monto Ejercido:	\$ 117,426.80
		Fin Real:	lunes, 4 de julio de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	21/04/2022	41.09%	41.09%	0.0%
3	06/06/2022	52.07%	52.07%	0.0%
4	19/06/2022	73.06%	73.06%	0.0%
5	02/06/2022	73.06%	73.06%	32.1%
6	16/06/2022	73.06%	73.06%	32.1%
7	30/06/2022	84.57%	84.57%	32.1%
8	14/07/2022	100.00%	100.00%	100.0%

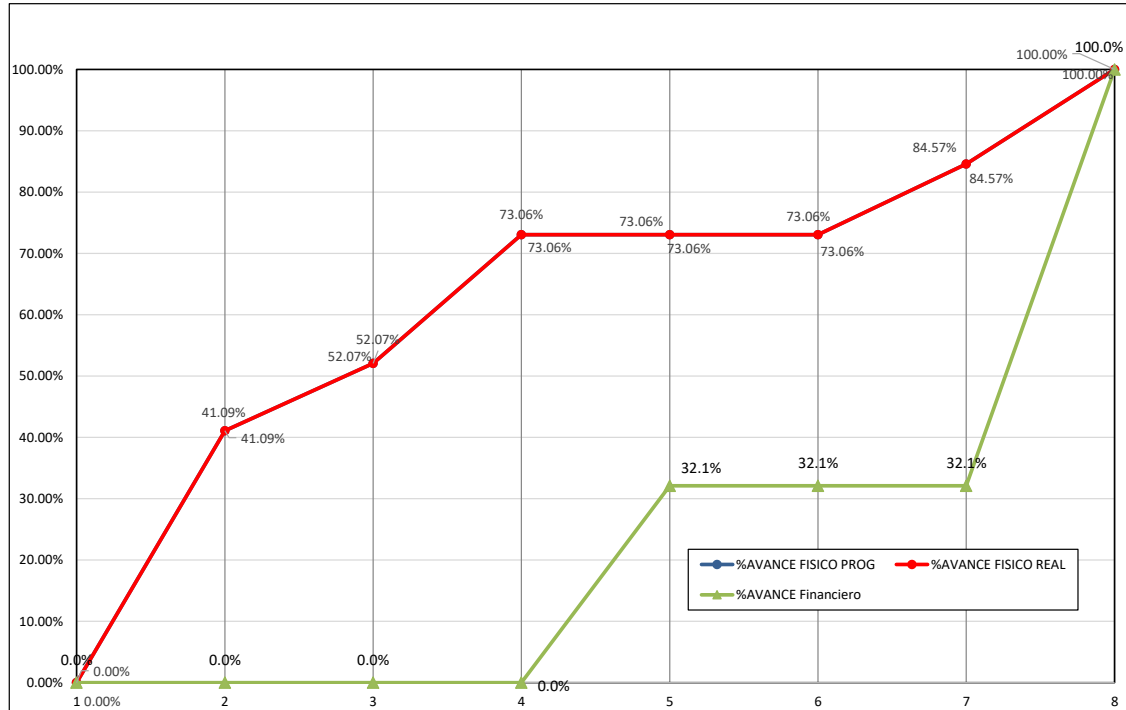

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
