


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, MECÁNICA DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS.				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	IPR 001 C 2022		
Tipo de inversión:	INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021	Contratista:	I.C. ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	Inicio Vigente:	viernes, 22 de abril de 2022	Días de Obra:	30
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	viernes, 22 de abril de 2022	Monto Contratado:	\$ 97,022.40
Residente:	ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	sábado, 21 de mayo de 2022	Monto Ejercido:	\$ 97,022.40
		Fin Real:	sábado, 21 de mayo de 2022		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2022	31.90%	31.90%	0.0%
3	20/05/2022	98.40%	98.40%	0.0%
4	03/06/2022	100.00%	100.00%	100.0%

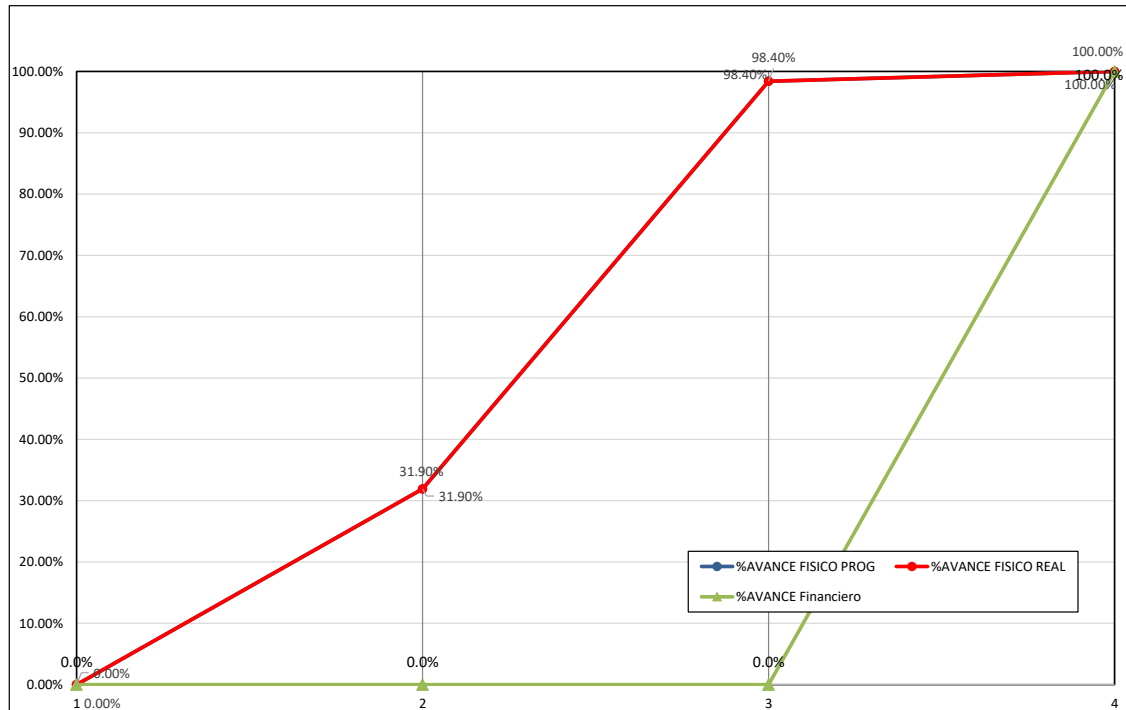

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
