


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IPR 001 D 2022  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021 **Contratista:** CYNERGIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.S. DE C.V.  
**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL **Inicio Vigente:** viernes, 22 de abril de 2022 **Días de Obra:** 180  
**Subprograma:** 03 SERVICIOS **Inicio Real:** viernes, 22 de abril de 2022 **Monto Contratado:** \$ 277,682.39  
**Residente:** ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES **Fin Vigente:** lunes, 20 de junio de 2022 **Monto Ejercido:** \$ 277,682.39  
**Fin Real:** lunes, 20 de junio de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2022	16.00%	16.00%	0.0%
3	20/05/2022	52.00%	52.00%	0.0%
4	03/06/2022	74.00%	74.00%	0.0%
5	17/06/2022	97.00%	97.00%	0.0%
6	30/06/2022	100.00%	100.00%	100.0%

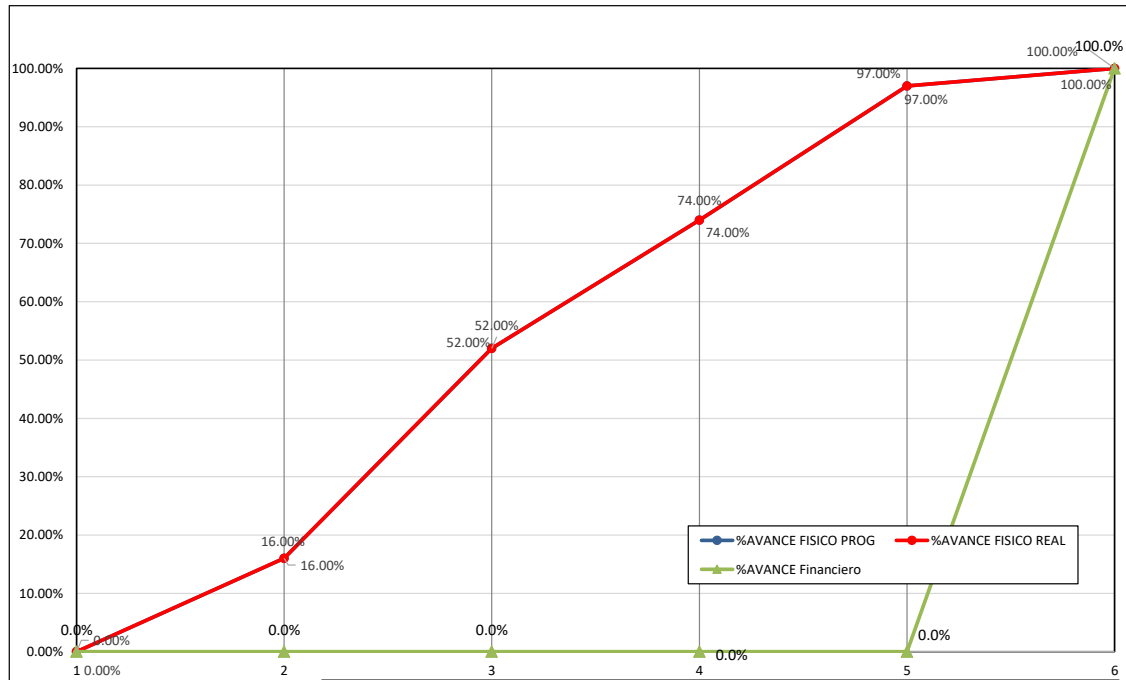

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
