


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE 24 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO ■
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IPR 001 E 2022
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021 **Contratista:** CYNERGIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.S. DE C.V.
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL **Inicio Vigente:** martes, 21 de junio de 2022 **Días de Obra:** 180
Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** martes, 21 de junio de 2022 **Monto Contratado:** \$ 249,999.86
Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES **Fin Vigente:** sábado, 17 de diciembre de 2022 **Monto Ejercido:** \$ 249,999.86
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/07/2022	5.12%	5.80%	0.0%
3	21/07/2022	17.91%	18.20%	0.0%
4	05/08/2022	33.66%	35.20%	0.0%
5	20/08/2022	51.51%	53.65%	0.0%
6	04/09/2022	55.75%	58.12%	37.1%
7	19/09/2022	59.98%	62.50%	37.1%
8	04/10/2022	65.80%	68.50%	61.4%
9	19/10/2022	74.73%		80%
10	03/11/2022	83.67%		
11	18/11/2022	92.60%		
12	03/12/2022	99.32%		
13	18/12/2022	100.00%		

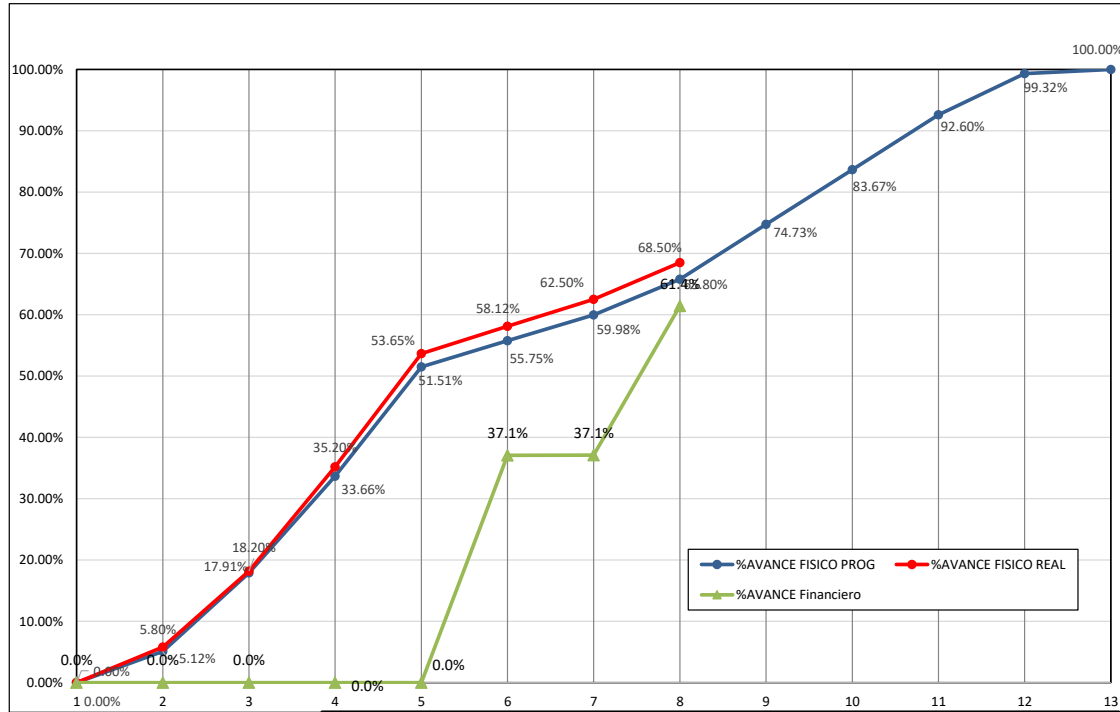

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
