

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 002/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FINAL DE LA PARCELA LADO SUR

**Ubicación:** LA GUAYANA

**Contrato:** PFR 002/2022

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019

**Contratista:** TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO

**Inicio Vigente:** sábado, 20 de agosto de 2022

**Días de Obra:** 30

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** sábado, 20 de agosto de 2022

**Monto Contratado:** \$ 280,000.00


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** domingo, 18 de septiembre de 2022

**Monto Ejercido:** \$ 280,000.00

**Fin Real:** domingo, 18 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/08/2022	2.54%	3.65%	0.00%
2	29/08/2022	15.20%	17.12%	0.00%
3	05/09/2022	65.86%	68.53%	0.00%
4	12/09/2022	72.15%	73.46%	0.00%
5	19/09/2022	100.00%	100.00%	0.00%
6	26/09/2022	100.00%	100.00%	0.00%

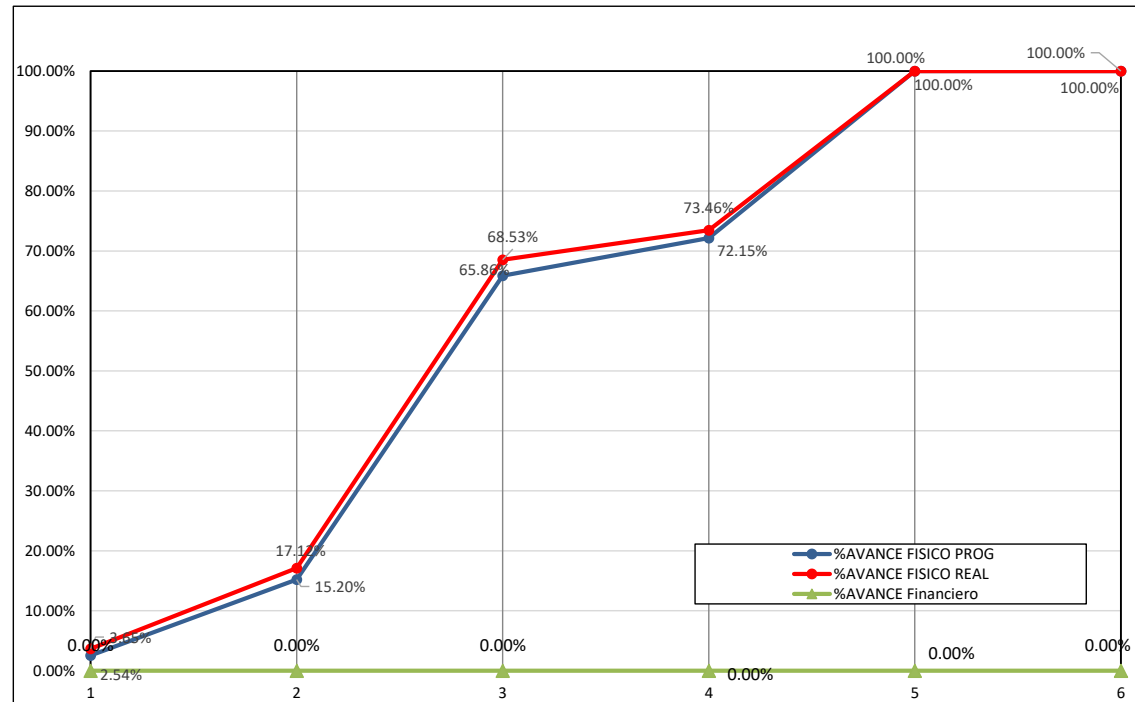

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
