

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 001/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN

Ubicación: LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FISMDF 001/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 5 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: viernes, 5 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$1,147,035.99


Residente: Ing.Carlos Armando Chávez García

Fin Vigente: lunes, 3 de octubre de 2022

Monto Ejercido: \$1,147,035.99

Fin Real: lunes, 3 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/08/2022	2.35%	3.25%	50.0%
2	15/08/2022	6.54%	7.52%	50.0%
3	22/08/2022	10.25%	12.65%	50.0%
4	29/08/2022	12.02%	14.54%	50.0%
5	05/09/2022	6.123%	63.51%	50.0%
6	12/09/2022	91.06%	93.45%	66.0%
7	19/09/2022	94.32%	97.43%	66.0%
8	26/09/2022	96.15%	98.35%	85.5%
9	03/10/2022	100.00%	100.00%	86.6%
10	10/10/2022	100.00%	100.00%	97.9%
11	17/10/2022	100.00%	100.00%	97.9%
12	24/10/2022	100.00%	100.00%	98.7%
13	31/10/2022	100.00%	100.00%	100.0%

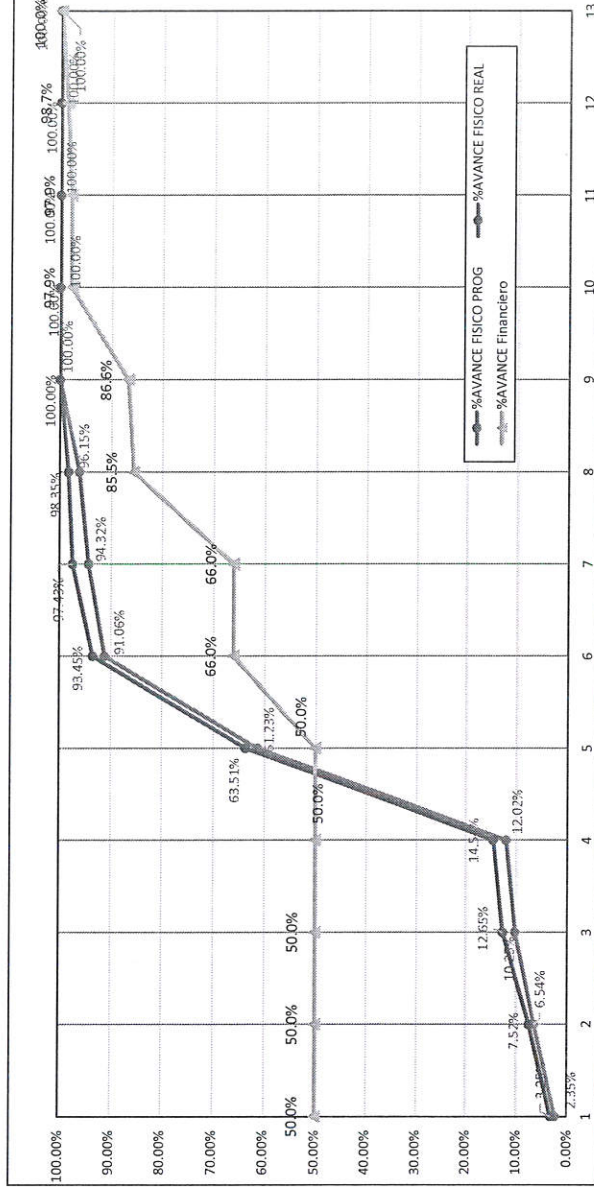

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
