

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: IP 001 D/2022

Contratista: SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: martes, 4 de octubre de 2022

Inicio Real: martes, 4 de octubre de 2022

Fin Vigente: viernes, 2 de diciembre de 2022

Fin Real: viernes, 2 de diciembre de 2022


Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$140,903.09

Monto Ejercido: \$140,903.09

NOTA: Se encuentra en supencion la obra

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/10/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	18/10/2022	34.24%	35.26%	0.0%
3	01/11/2022	62.37%	40.68%	0.0%
4	15/11/2022	81.62%	40.58%	0.0%
5	29/11/2022	94.07%	40.58%	0.0%
6	13/12/2022	100.00%	40.58%	0.0%

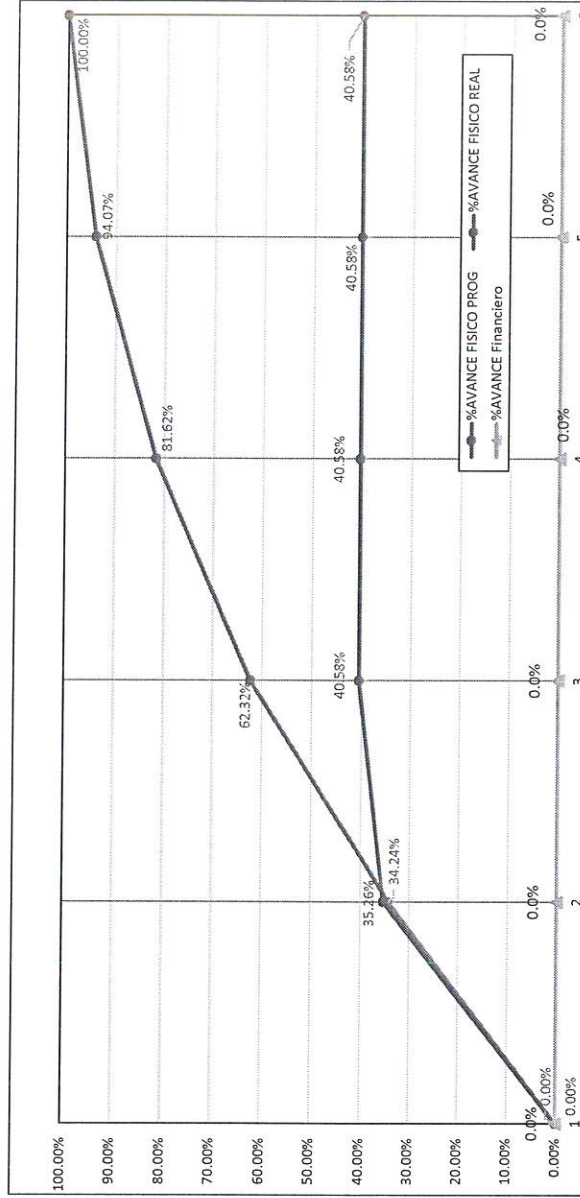

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

J. J. Hernandez Fuentes
