

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO REGENERACION DE IMAGEN URBANA, FACHADAS Y ESPACIO URBANO (BENITO JUAREZ SUR DE AV SAUCE-LA PAZ AL NORTE Y CARLOS SALINAS DE GORTARI-PARQUE SUR DE BEISBOL SAN FRANCISCO)

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: IP 001 E/2022

Contratista: CYNERGIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.S. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 11 de noviembre de 2022

Inicio Recl: viernes, 11 de noviembre de 2022

Fin Vigente: domingo, 25 de diciembre de 2022


Fin Recl: domingo, 25 de diciembre de 2022

Días de Obra: 45

Monto Contratado: \$254,999,99

Monto Ejercido: \$254,999,99

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	11/11/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	25/11/2022	23.00%	23.12%	0.0%
3	09/12/2022	46.20%	46.35%	0.0%
4	23/12/2022	97.56%	97.57%	0.0%
5	06/01/2023	100.00%		
6	20/01/2023	100.00%		

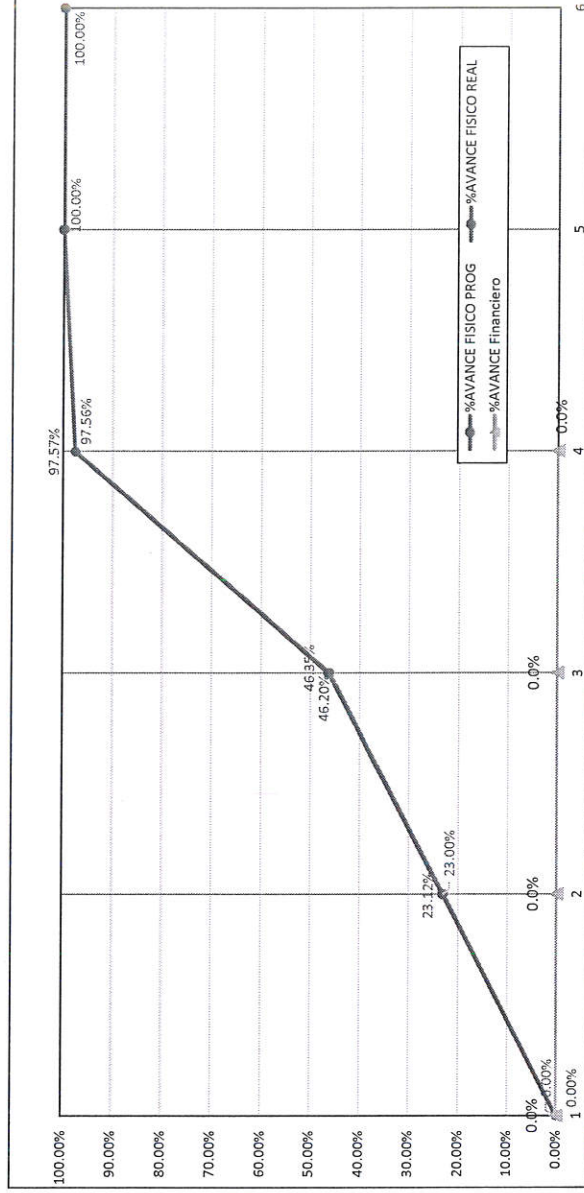

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
