

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES AÉREAS, EN EL BLVD. DE ACCESO A SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. POR PROYECTO DE ROTONDA FRENTE A PARQUE DE BEISBOL Y SALIDA A EMILIANO ZAPATA.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 001 F/2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS

Contratista: ELECTROSERVICIOS MEDHER SA DE CV

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG.

Días de Obra: 45

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: martes, 6 de diciembre de 2022

Monto Contratado: \$122,640,93


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: jueves, 19 de enero de 2023

Monto Ejercido: \$122,640,93

Fin Real: jueves, 19 de enero de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/12/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	20/12/2022	35.79%	35.89%	0.0%
3	03/01/2023	63.28%	63.56%	0.0%
4	17/01/2023	92.56%		
5	31/01/2023	100.00%		
6	14/02/2023	100.00%		

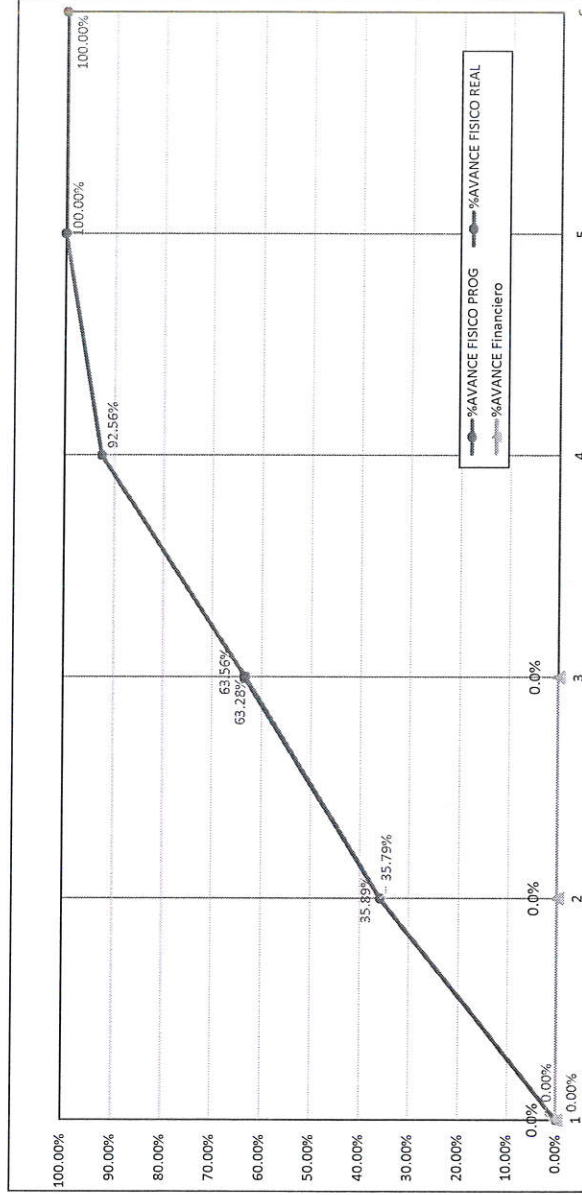

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
