

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 002/2022 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2022

Programa: SD ALCANTARILLADO

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: IP 002/2022

Contratista: ELECTROSERVICIOS MEDHER SA DE CV

Inicio Vigente: jueves, 29 de diciembre de 2022

Inicio Real: jueves, 29 de diciembre de 2022

Fin Vigente: domingo, 26 de febrero de 2023


Fin Real: domingo, 26 de febrero de 2023

Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$1,610,879.07

Monto Ejercido: \$1,674,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/12/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	12/01/2023	1.34%		
3	26/01/2023	68.45%		
4	09/02/2023	70.12%		
5	23/02/2023	98.45%		
6	09/03/2023	100.00%		

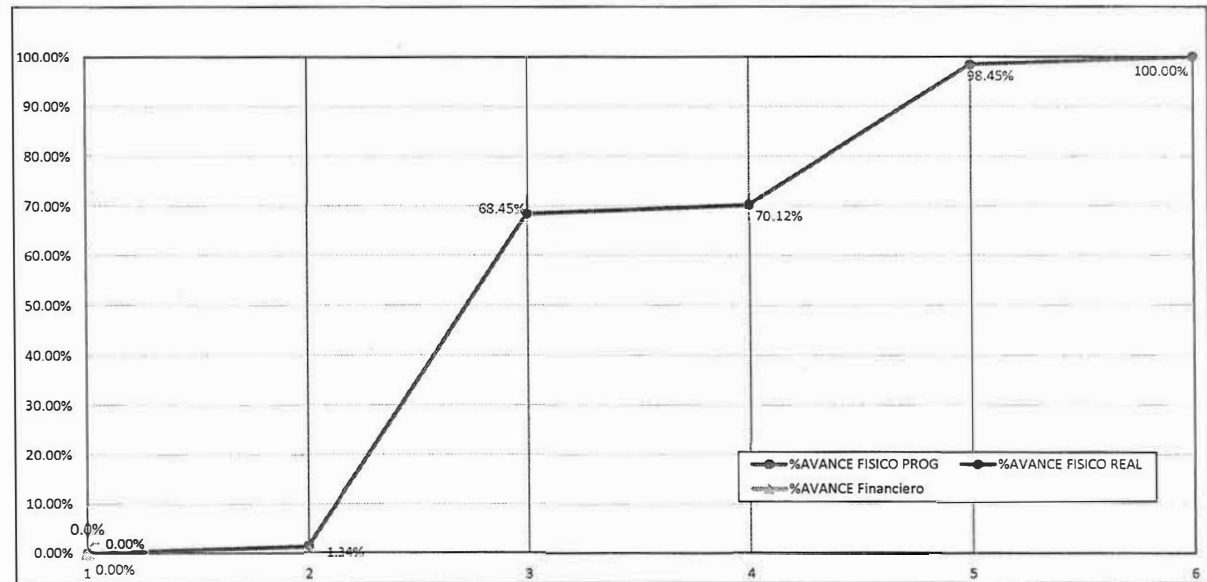

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
