

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, MECÁNICA DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ROTONDA Y VIALIDADES AV. BENITO JUÁREZ, PARA ESCULTURA DE SAN FRANCISCO DE ASIS. SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: IPR 001 C 2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021

Contratista: I.C. ANGEL DE JESUS RAMIREZ GUARDADO.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Inicio Vigente: viernes, 22 de abril de 2022

Días de Obra: 30

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: viernes, 22 de abril de 2022

Monto Contratado: \$ 97,022.40


Fin Vigente: sábado, 21 de mayo de 2022

Monto Ejercido: \$ 97,022.40

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Fin Real: sábado, 21 de mayo de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/04/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/05/2022	31.90%	31.90%	0.0%
3	20/05/2022	98.40%	98.40%	0.0%
4	03/06/2022	100.00%	100.00%	100.0%

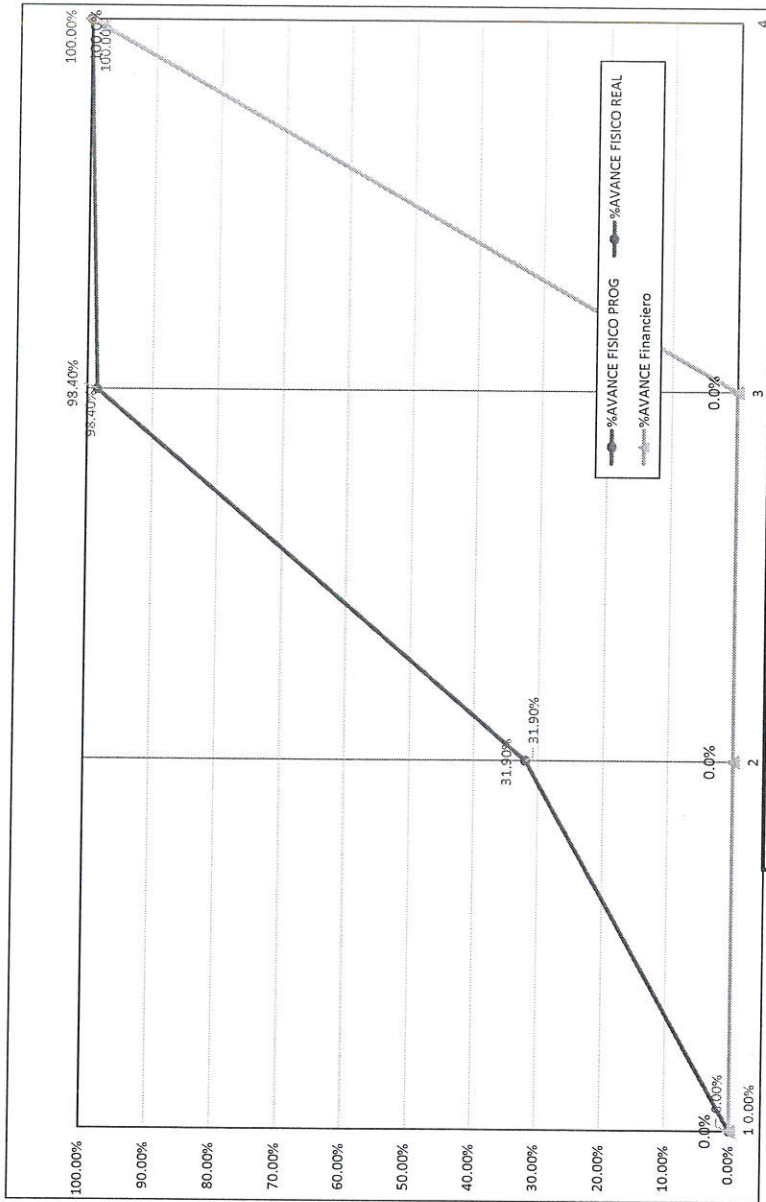

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten Signature]
