

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, DELEGACIÓN PUERTRECITO DE LA VIRGEN


Ubicación: DELEGACIÓN PUERTRECITO DE LA VIRGEN  
 Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2021  
 Programa: DA EDIFICIOS PUBLICOS

Contrato: PFR 001/2022  
 Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 4 de mayo de 2022      Días de Obra: 90  
 Inicio Real: miércoles, 4 de mayo de 2022      Monto Contratado: \$ 1,674,000.00  
 Fin Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022      Monto Ejercido: \$ 1,674,000.00  
 Fin Real: lunes, 1 de agosto de 2022

Subprograma: 03 CONTRUCCION  
 Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/05/2022	0.00%	0.00%	50.00%
2	09/05/2022	2.06%	2.50%	50.00%
3	16/05/2022	5.07%	5.90%	50.00%
4	23/05/2022	8.86%	9.10%	50.00%
5	30/05/2022	17.10%	18.20%	50.00%
6	06/06/2022	24.79%	26.50%	63.42%
7	13/06/2022	31.79%	32.12%	63.42%
8	20/06/2022	42.25%	44.00%	63.42%
9	27/06/2022	52.34%	53.11%	75.38%
10	04/07/2022	66.32%	68.00%	81.29%
11	11/07/2022	74.79%	76.50%	81.29%
12	18/07/2022	84.07%	85.98%	81.29%
13	25/07/2022	95.27%	96.74%	81.29%
14	01/08/2022	100.00%	100.00%	81.29%
15	08/08/2022	100.00%	100.00%	81.29%
16	15/08/2022	100.00%	100.00%	100.00%

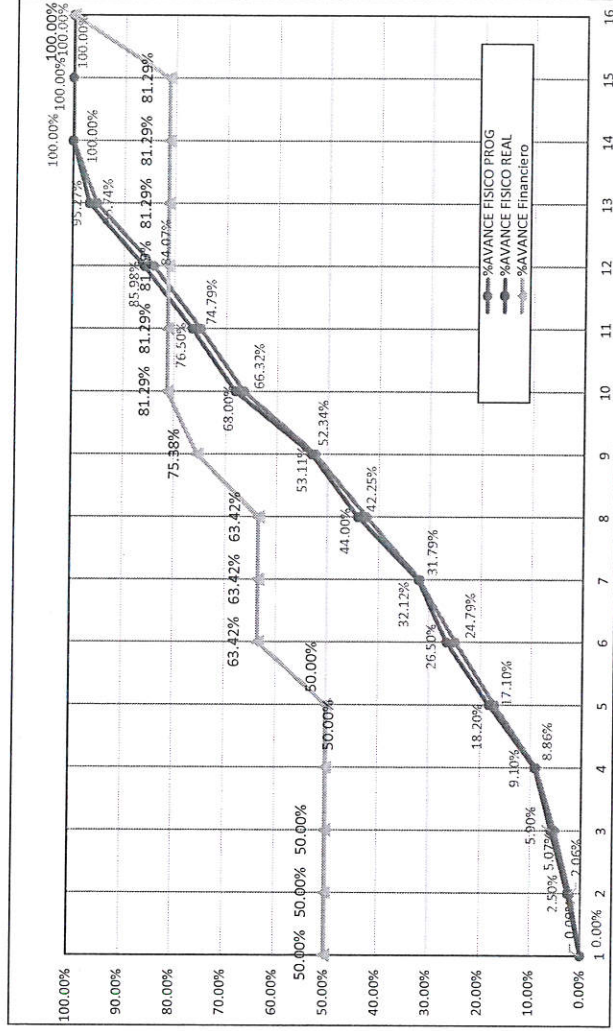

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
