

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 036/2022 EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES

Ubicación: (FRACC. SANTA BARBARA, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, CHICALOTE, MACARIO J. GÓMEZ, CONCEPCIÓN, LA ESCONDIDA, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENA VISTA, URBIVILLAS DEL VERGEL, EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, AMAPOLAS DEL RÍO, LOREITTO, FRACC. REVOLUCIÓN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

Contrato: FISMDF 036/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA


Subprograma: EQUIPAMIENTO

Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS

Inicio Vigente: jueves, 15 de diciembre de 2022  
 Inicio Real: jueves, 15 de diciembre de 2022  
 Fin Vigente: miércoles, 21 de diciembre de 2022  
 Fin Real: miércoles, 21 de diciembre de 2022

Días de Obra: 7 días  
 Monto Contratado: \$149,557.18  
 Monto Ejercido: \$149,557.18

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/12/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	22/12/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	29/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

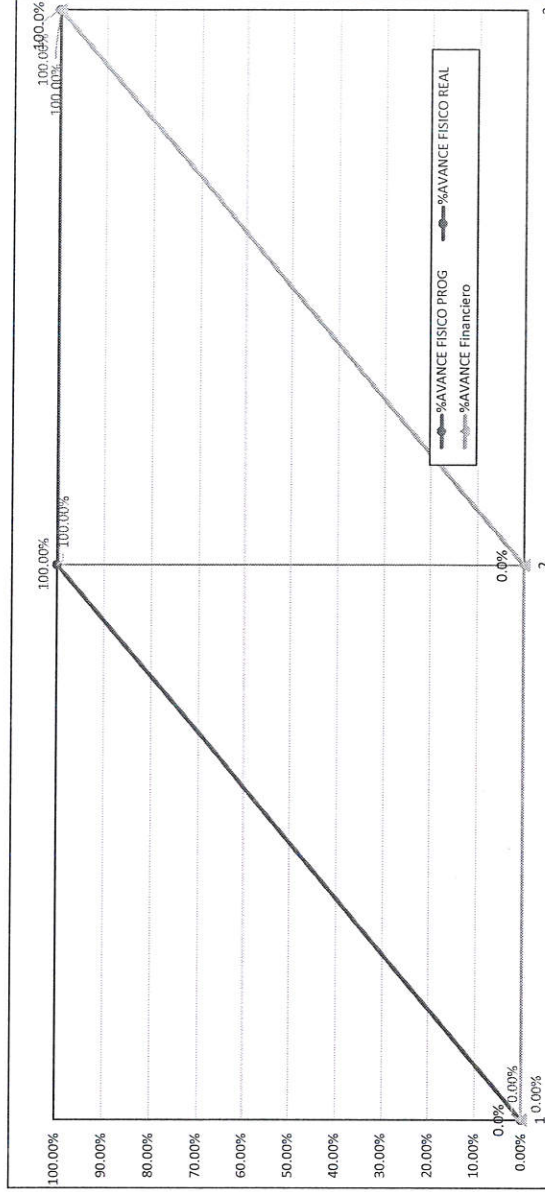

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Ángel C.
