

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE 24 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IPR 001 E 2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021

Contratista: C. ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Días de Obra: 180

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Vigente: martes, 21 de junio de 2022

Monto Contratado: \$ 249,999.86


Residente: ARQ. MIGUEL ÁNGEL CASTORENA ARIAS

Fin Vigente: sábado, 17 de diciembre de 2022

Monto Ejercido: \$ 249,999.86

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	06/07/2022	5.12%	5.80%	0.0%
3	21/07/2022	17.91%	18.20%	0.0%
4	05/08/2022	33.66%	35.20%	0.0%
5	20/08/2022	51.51%	53.65%	0.0%
6	04/09/2022	55.75%	58.12%	37.1%
7	19/09/2022	59.98%	62.50%	37.1%
8	04/10/2022	65.80%	68.50%	61.4%
9	19/10/2022	74.73%	75.95%	61.4%
10	03/11/2022	83.67%	85.46%	61.4%
11	18/11/2022	92.60%	94.87%	61.4%
12	03/12/2022	99.32%	99.38%	61.4%
13	18/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

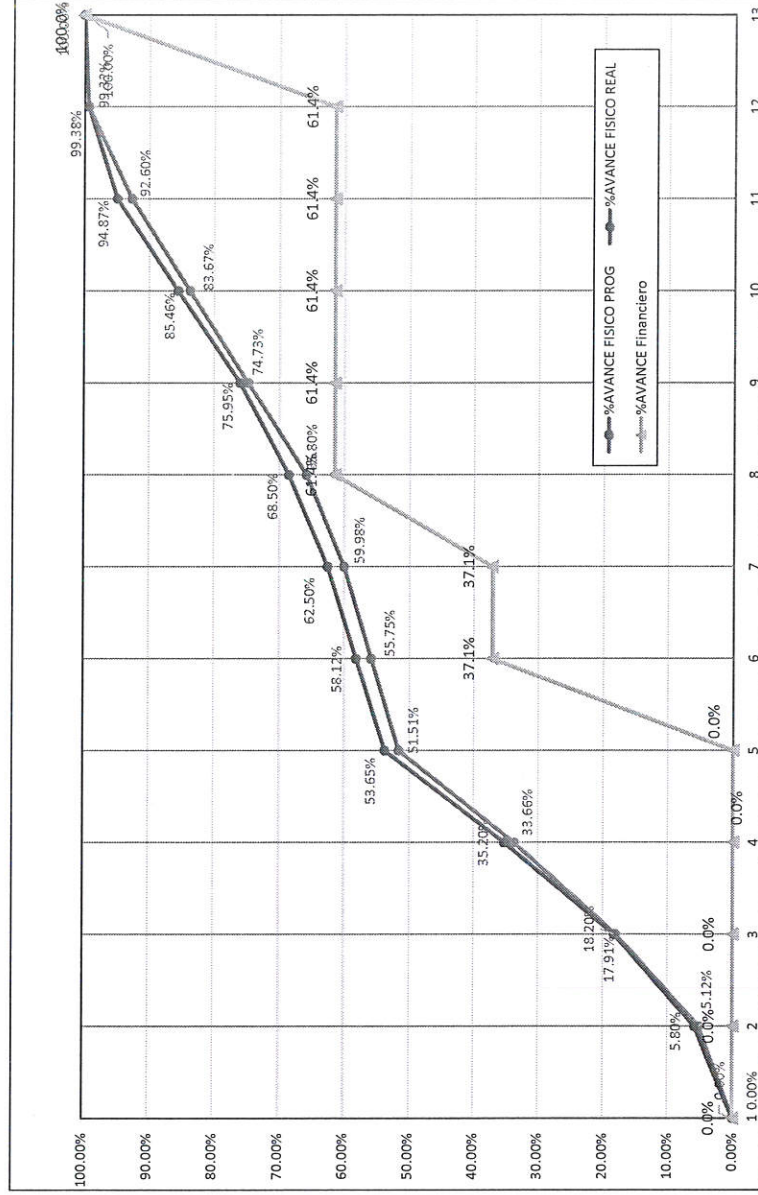

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Angel C.
