

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

FISMDF 017/2022

FISMDF 003/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN

Ubicación: COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FISMDF 003-017/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 19 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: viernes, 19 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$1,440,863.93

Residente: Ing.Carlos Armando Chávez García


Fin Vigente: lunes, 17 de octubre de 2022

Monto Ejercido: \$1,163,904.29

Fin Real: lunes, 17 de octubre de 2022

Nota: Metas cumplidas al 100%

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/08/2022	1.07%	6.21%	50.0%
2	29/08/2022	8.19%	10.15%	50.0%
3	05/09/2022	21.89%	26.54%	50.0%
4	12/09/2022	40.95%	50.32%	50.0%
5	19/09/2022	56.07%	57.48%	50.0%
6	26/09/2022	63.94%	64.52%	61.3%
7	03/10/2022	73.20%	79.30%	61.3%
8	10/10/2022	92.35%	95.23%	69.2%
9	17/10/2022	100.00%	100.00%	69.2%
10	24/10/2022	100.00%	100.00%	75.6%
11	31/10/2022	100.00%	100.00%	75.6%
12	07/11/2022	100.00%	100.00%	76.1%
13	14/11/2022	100.00%	100.00%	76.1%
14	21/11/2022	100.00%	100.00%	100.0%

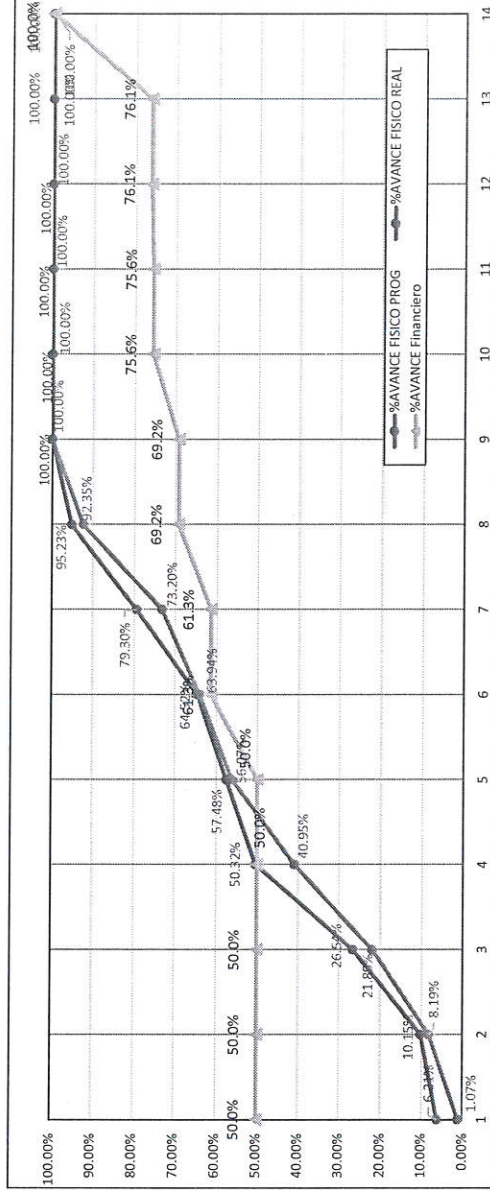

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
