

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 006/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA
 FISMDF 008/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ A LIMITE NORTE
 FISMDF 009/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIONARIOS Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA
 FISMDF 026/2022 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS LA CONCEPCIÓN

Ubicación: LA CONCEPCIÓN Contrato: FISMDF 006-008-009-026/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022 Días de Obra: 60 días
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022 Monto Contratado: \$1,659,848.26
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022 Monto Ejercido: \$1,659,848.26
 Fin Real: jueves, 29 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	08/08/2022	12.40%	14.64%	50.0%
3	15/08/2022	34.42%	36.32%	50.0%
4	22/08/2022	51.23%	55.34%	50.0%
5	29/08/2022	67.84%	69.74%	50.0%
6	05/09/2022	71.35%	71.56%	50.0%
7	12/09/2022	75.32%	77.64%	50.0%
8	19/09/2022	81.58%	83.79%	70.5%
9	26/09/2022	96.32%	97.48%	70.5%
10	03/10/2022	100.00%	100.00%	70.5%
11	10/10/2022	100.00%	100.00%	70.5%
12	17/10/2022	100.00%	100.00%	70.5%
13	24/10/2022	100.00%	100.00%	70.5%
14	31/10/2022	100.00%	100.00%	100.0%

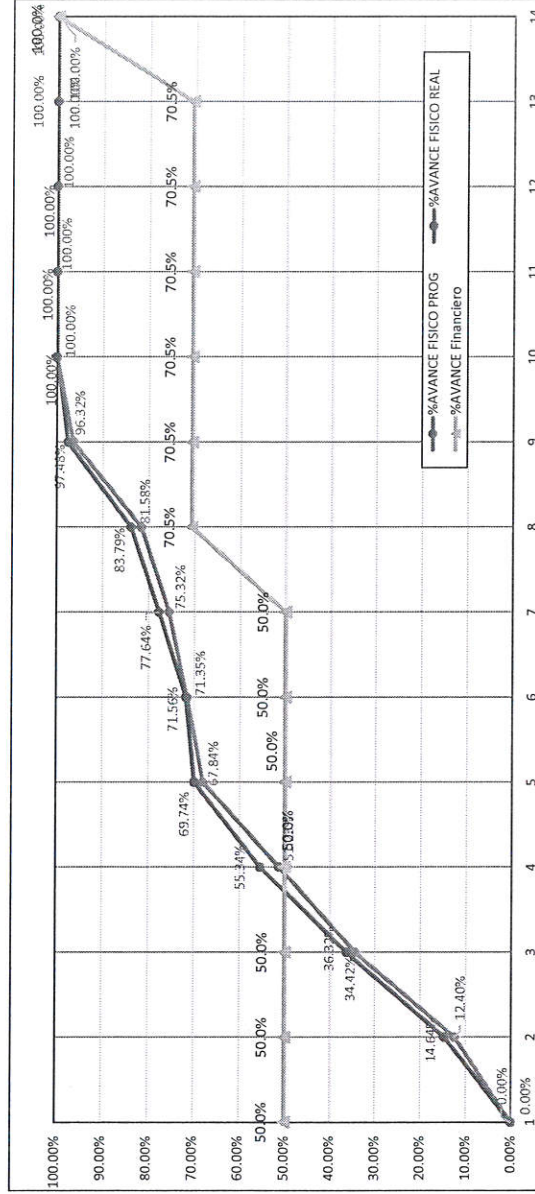

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
