

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 035/2022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA EN ZONA SUR**

Ubicación: **CHICALOTE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

Contrato: **FISMDF 035/2022**

Tipo de inversión: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022**

Contratista: **BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

Programa: **S.H. VIVIENDA DIGNA**

Inicio Vigente: **jueves, 15 de diciembre de 2022**

Días de Obra: **7 días**

Subprograma: **02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA**

Inicio Recl: **jueves, 15 de diciembre de 2022**

Monto Contratado: **\$256,095.11**


Residente: **T.C. FERNANDO LUNA MEDINA**

Fin Vigente: **miércoles, 21 de diciembre de 2022**

Monto Ejercido: **\$256,095.11**

Fin Recl: **miércoles, 21 de diciembre de 2022**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/12/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	22/12/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	29/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

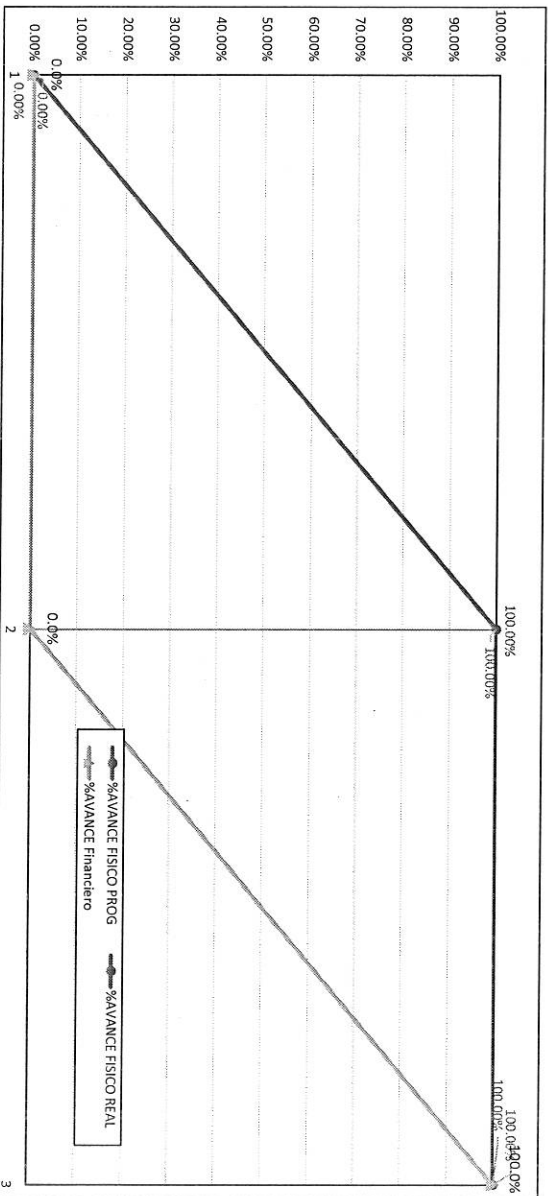

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

1
