

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ABUELO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SOLIDO Y PR SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESREG.

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contratista: ELECTROSERVICIOS MEDHER S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: jueves, 2 de junio de 2022

Inicio Real: jueves, 2 de junio de 2022

Fin Vigente: jueves, 28 de julio de 2022


Fin Real: jueves, 28 de julio de 2022

Días de Obra: 45

Monto Contratado: \$38,010.00

Monto Ejercido: \$38,010.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	16/06/2022	42.00%	42.00%	0.0%
3	30/06/2022	51.22%	51.22%	0.0%
4	14/07/2022	60.83%	60.83%	0.0%
5	28/07/2022	63.83%	63.83%	0.0%
6	11/08/2022	100.00%	100.00%	100.0%

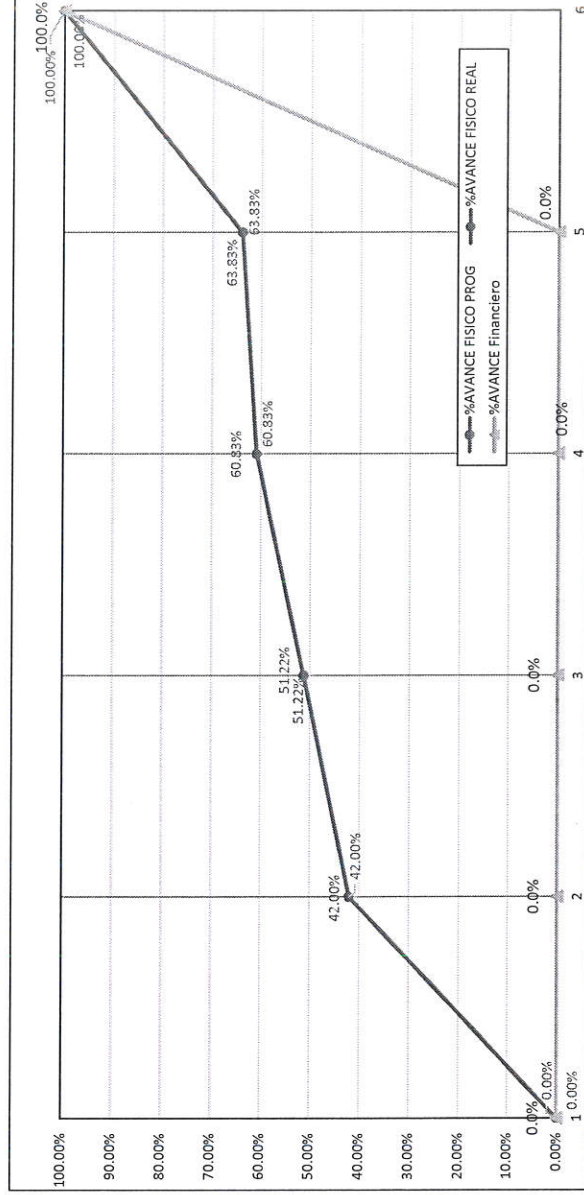

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
