

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 002/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA

Ubicación: COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FISMDF 002/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022

Monto Contratado: \$1,618,837.15


Residente: Ing.Carlos Armando Chávez García

Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022

Monto Ejercido: \$1,618,837.15

Fin Real: jueves, 29 de septiembre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	08/08/2022	3.70%	4.53%	50.0%
3	15/08/2022	10.45%	12.43%	50.0%
4	22/08/2022	45.29%	49.41%	50.0%
5	29/08/2022	64.54%	66.84%	50.0%
6	05/09/2022	75.09%	77.86%	67.1%
7	12/09/2022	80.36%	83.64%	67.1%
8	19/09/2022	83.26%	85.55%	67.1%
9	26/09/2022	95.20%	97.46%	77.0%
10	03/10/2022	100.00%	100.00%	87.7%
11	10/10/2022	100.00%	100.00%	87.7%
12	17/10/2022	100.00%	100.00%	87.7%
13	24/10/2022	100.00%	100.00%	98.6%
14	31/10/2022	100.00%	100.00%	100.0%

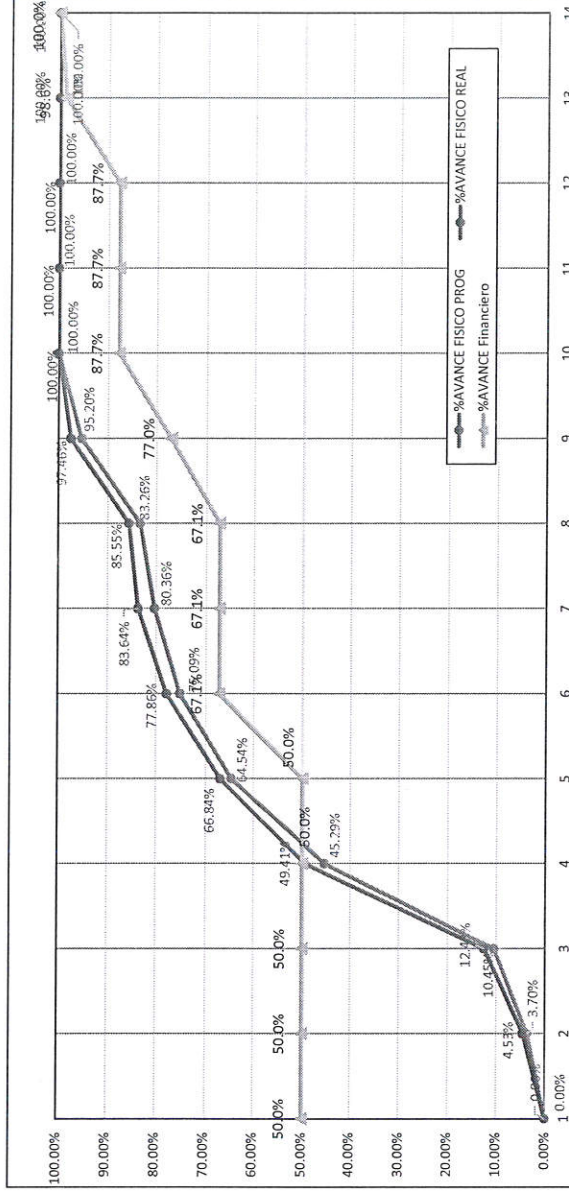

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
