


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 005/2022 REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL MONTE TRAMO CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ
 FISMDF 010/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR
 FISMDF 013/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE JACARANDA Y PRIVADA JAIME NUÑO
 FISMDF 014/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JACARANDA
 FISMDF 019/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL MONTE ENTRE LA CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ
 FISMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUÑO
 FISMDF 022/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ Contrato: FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 Contratista: C. Jorge Armando Quezada Sotelo

Programa: SD ALCANTARILLADO Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022 Dias de Obra: 60 días
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022 Monto Contratado: \$1,084,276.93
 Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022 Monto Ejercido: \$1,017,588.40
 Nota: Metas cumplidas al 100%

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	08/08/2022	12.16%	13.65%	50.0%
3	15/08/2022	37.50%	39.52%	50.0%
4	22/08/2022	44.65%	45.30%	50.0%
5	29/08/2022	54.35%	57.85%	50.0%
6	05/09/2022	78.65%	80.12%	50.0%
7	12/09/2022	91.08%	91.32%	50.0%
8	19/09/2022	95.12%	96.36%	50.0%
9	26/09/2022	97.30%	98.15%	50.0%
10	03/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
11	10/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
12	17/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
13	24/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
14	31/10/2022	100.00%	100.00%	50.0%
15	07/11/2022	100.00%	100.00%	50.0%

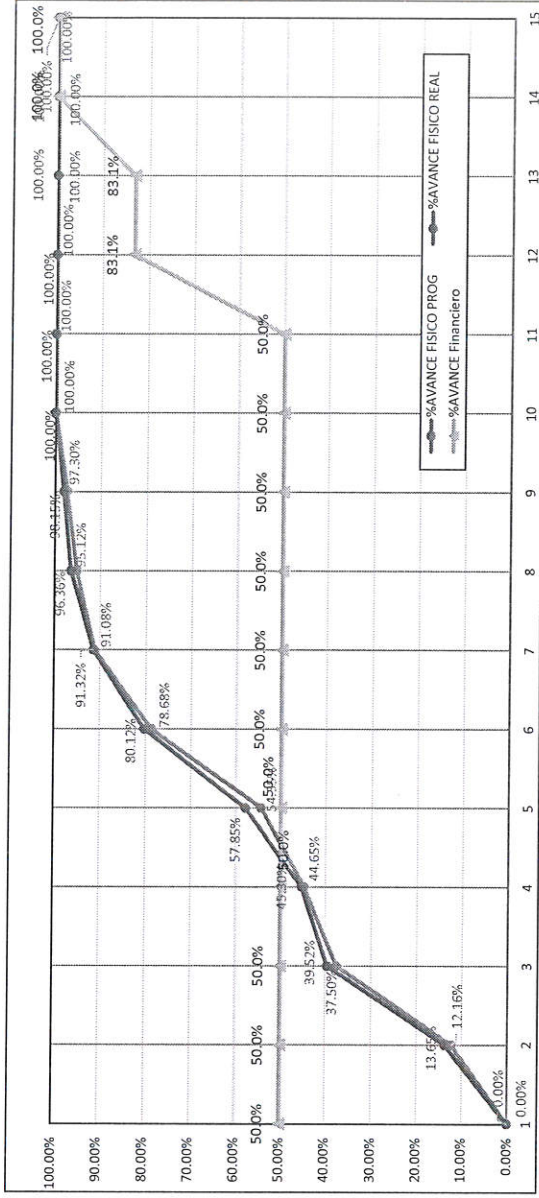

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten Signature]
