

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 011/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA CONCEPCIÓN
 FISMDF 012/2022 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA GUAYANA

Ubicación: PUERTICITO DE LA VIRGEN
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
 Subprograma: 02 RURAL, AMPLIACIÓN
 Residentes: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: FISMDF 011-012/2022
 Contratista: ECOSTRUCTURACIONES, S.A. DE C.V.
 Inicio Vigente: viernes, 14 de octubre de 2022
 Inicio Recl: viernes, 14 de octubre de 2022
 Fin Vigente: domingo, 27 de noviembre de 2022
 Fin Recl: domingo, 27 de noviembre de 2022
 Dias de Obra: 45 días
 Monto Contratado: \$909,117.85
 Monto Ejercido: \$905,831.49
 Nota: Metros cumplidos al 100%

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/10/2022	10.23%	12.30%	50.0%
2	24/10/2022	23.50%	25.60%	50.0%
3	31/10/2022	34.42%	36.30%	50.0%
4	07/11/2022	57.12%	59.54%	50.0%
5	14/11/2022	69.20%	70.30%	60.6%
6	21/11/2022	91.06%	93.50%	60.6%
7	28/11/2022	100.00%	100.00%	60.6%
8	05/12/2022	100.00%	100.00%	60.6%
9	12/12/2022	100.00%	100.00%	60.6%
10	19/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

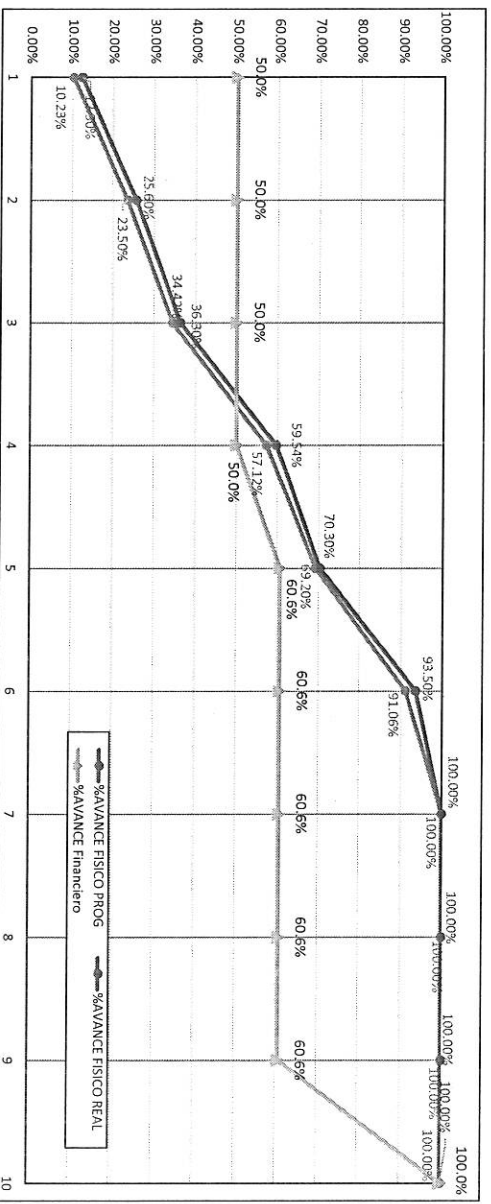

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
