

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 015/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO ENTRE LA AVENIDA SAUCE Y CALLE LICENCIADO OTTO GRANADOS ROLDAN

Ubicación: COLONIA LOS CEDROS

Contrato: FISMDF 015/2022

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Contratista: ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: SC AGUA POTABLE

Días de Obra: 45 días


Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Monto Contratado: \$541,331.26

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Monto Ejercido: \$541,331.26

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/08/2022	3.03%	5.65%	50.0%
2	27/08/2022	10.56%	13.56%	50.0%
3	03/09/2022	28.75%	36.00%	50.0%
4	10/09/2022	54.73%	60.00%	50.0%
5	17/09/2022	61.52%	77.20%	50.0%
6	24/09/2022	89.17%	95.00%	57.4%
7	01/10/2022	100.00%	100.00%	57.4%
8	08/10/2022	100.00%	100.00%	73.1%
9	15/10/2022	100.00%	100.00%	73.1%
10	22/10/2022	100.00%	100.00%	98.6%
11	29/10/2022	100.00%	100.00%	98.6%
12	05/11/2022	100.00%	100.00%	100.0%

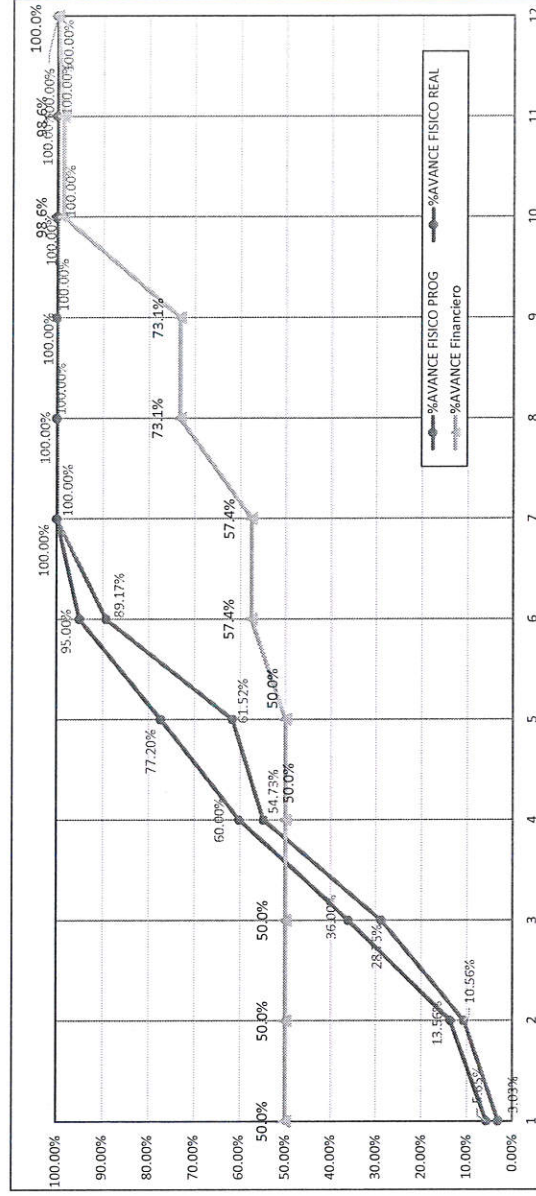

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
