


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 016/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MÉXICO Y CALLE BOLIVIA

Ubicación: COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
 Contrato: FISMDF 016/2022
 Contratista: O. L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

Programa: SC AGUA POTABLE
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
 Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 Inicio Vigente: viernes, 5 de agosto de 2022
 Inicio Recl: viernes, 5 de agosto de 2022
 Fin Vigente: lunes, 3 de octubre de 2022
 Fin Recl: lunes, 3 de octubre de 2022
 Dias de Obra: 60 días
 Monto Contratado: \$865,794.98
 Monto Ejecutado: \$865,794.98

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/08/2022	1.63%	2.66%	50.0%
2	15/08/2022	8.48%	10.32%	50.0%
3	22/08/2022	18.57%	22.45%	50.0%
4	29/08/2022	28.46%	32.65%	50.0%
5	05/09/2022	38.35%	40.36%	50.0%
6	12/09/2022	48.24%	52.36%	58.17%
7	19/09/2022	58.17%	60.37%	60.1%
8	26/09/2022	68.06%	72.45%	60.1%
9	03/10/2022	77.95%	82.45%	60.1%
10	10/10/2022	87.84%	92.45%	73.7%
11	17/10/2022	97.73%	102.45%	73.7%
12	24/10/2022	107.62%	112.45%	98.6%
13	31/10/2022	117.51%	122.45%	98.6%
14	07/11/2022	127.40%	132.45%	100.0%

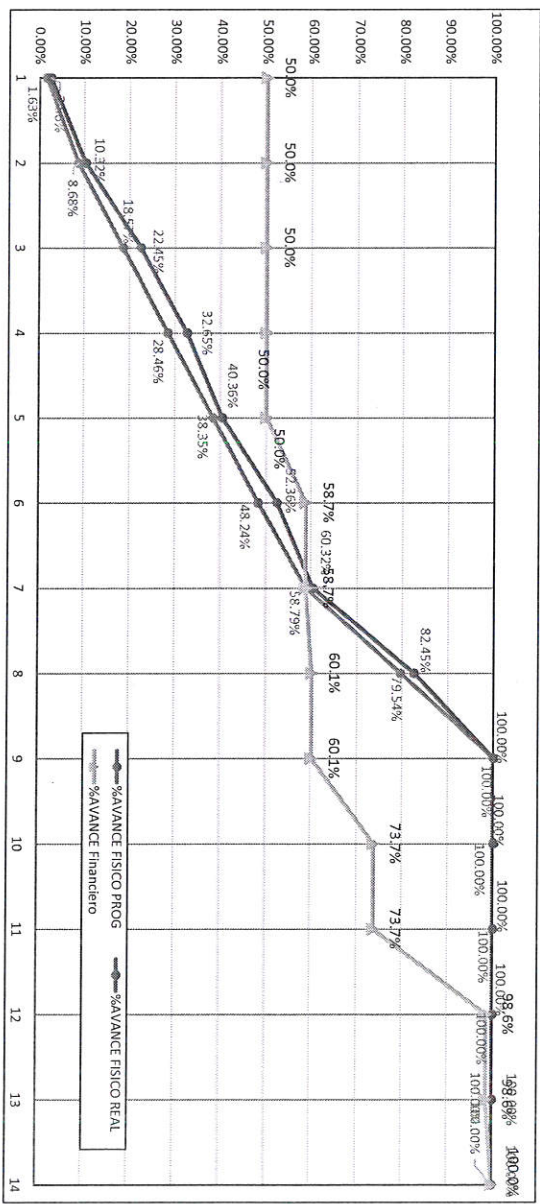

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
