

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 023/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS**


Ubicación: **EX VIÑEDOS GUADALUPE**
 Tipo de inversión: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022**
 Contratista: **C. I. C. Azael Jarro Córdoba Huerta.**

Programa: **SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES**
 Subprograma: **01 CONCRETO**
 Residente: **T. C. FERNANDO LUNA MEDINA**

Inicio Vigente: **viernes, 5 de agosto de 2022**
 Inicio Recl: **viernes, 5 de agosto de 2022**
 Fin Vigente: **lunes, 3 de octubre de 2022**
 Fin Recl: **lunes, 3 de octubre de 2022**

Días de Obra: **60 días**
 Monto Contratado: **\$1,524,195.64**
 Monto Ejercido: **\$1,511,058.12**
 Nota: **Metas cumplidas al 100%**

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 08/08/2022 | 3.24% | 5.65% | 50.0% |
| 2 | 15/08/2022 | 6.35% | 9.46% | 50.0% |
| 3 | 22/08/2022 | 7.44% | 9.85% | 50.0% |
| 4 | 29/08/2022 | 8.43% | 10.65% | 50.0% |
| 5 | 05/09/2022 | 28.40% | 28.65% | 79.3% |
| 6 | 12/09/2022 | 44.36% | 46.87% | 79.3% |
| 7 | 19/09/2022 | 62.33% | 64.87% | 79.3% |
| 8 | 26/09/2022 | 80.73% | 83.49% | 79.3% |
| 9 | 03/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 96.9% |
| 10 | 10/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 96.9% |
| 11 | 17/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 96.9% |
| 12 | 24/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 96.9% |
| 13 | 31/10/2022 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |

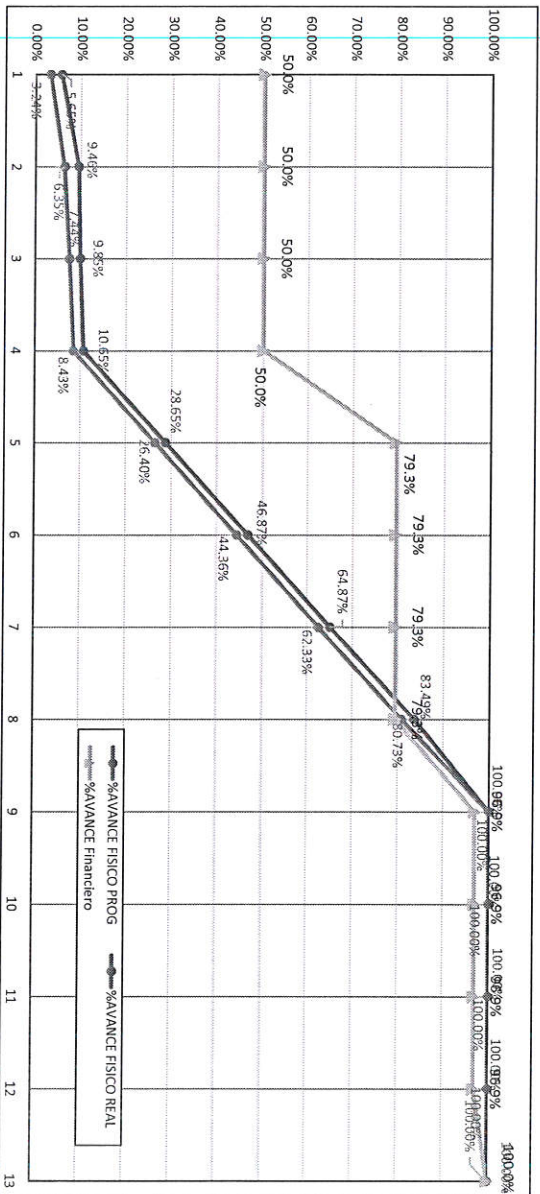

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

L
