


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 027/2022 CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA EDMUNDO GÁMEZ OROZCO ENTRE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO Y LIMITE SUR

Ubicación: LA ESCONDIDA  
 Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022  
 Contrato: FISMDF 027/2022  
 Contratista: TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

Programa: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, Inicio Vigente: jueves, 15 de septiembre de 2022, Dias de Obra: 45 días  
 Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Inicio Real: jueves, 15 de septiembre de 2022, Monto Contratado: \$613,092.14  
 Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES Fin Vigente: sábado, 29 de octubre de 2022, Monto Ejercido: \$613,092.14  
 Fin Real: sábado, 29 de octubre de 2022

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/09/2022	15.83%	14.00%	50.0%
2	26/09/2022	24.29%	26.00%	50.0%
3	03/10/2022	44.39%	36.00%	50.0%
4	10/10/2022	55.37%	60.00%	50.0%
5	17/10/2022	79.59%	77.20%	50.0%
6	24/10/2022	93.00%	95.00%	50.0%
7	31/10/2022	100.00%	100.00%	84.0%
8	07/11/2022	100.00%	100.00%	84.0%
9	14/11/2022	100.00%	100.00%	97.0%
10	21/11/2022	100.00%	100.00%	97.0%
11	28/11/2022	100.00%	100.00%	100.0%

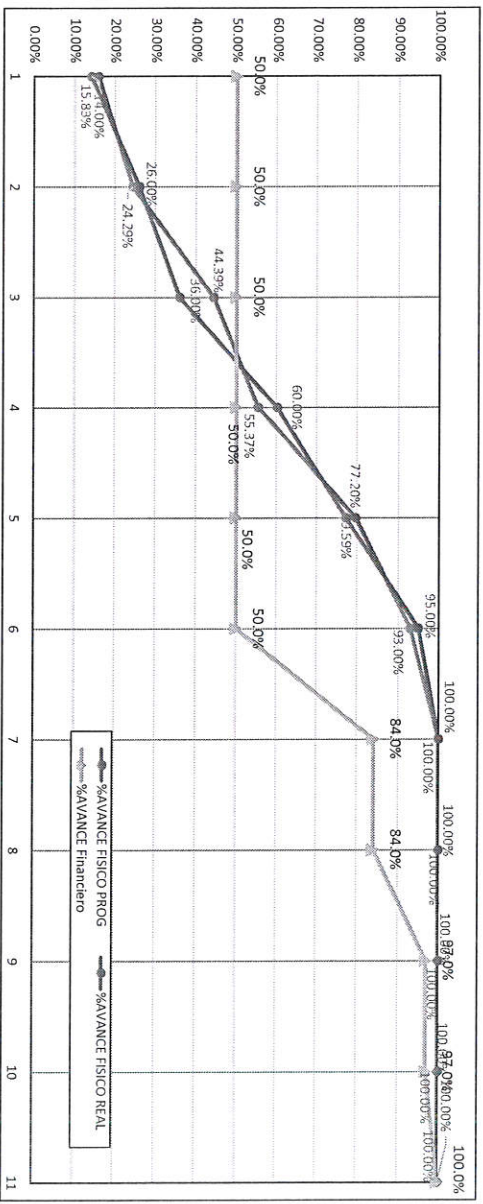

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

*[Handwritten Signature]*
