

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 029/2022 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE**

Ubicación: (AMAPOLAS; BORROTES; OJO DE AGUA DEL MEZQUITE; LOS ARELLANOS Y TEPETATE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA

Subprograma: 02 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 029/2022

Contratista: FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 2 de noviembre de 2022

Inicio Real: miércoles, 2 de noviembre de 2022

Fin Vigente: viernes, 16 de diciembre de 2022


Fin Real: viernes, 16 de diciembre de 2022

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$908,842.09

Monto Ejecido: \$908,842.09

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/11/2022	9.87%	10.23%	50.0%
2	14/11/2022	21.65%	26.35%	50.0%
3	21/11/2022	34.14%	35.41%	50.0%
4	28/11/2022	41.23%	43.85%	50.0%
5	05/12/2022	82.72%	84.65%	50.0%
6	12/12/2022	91.50%	93.54%	50.0%
7	19/12/2022	100.00%	100.00%	50.0%
8	26/12/2022	100.00%	100.00%	100.0%

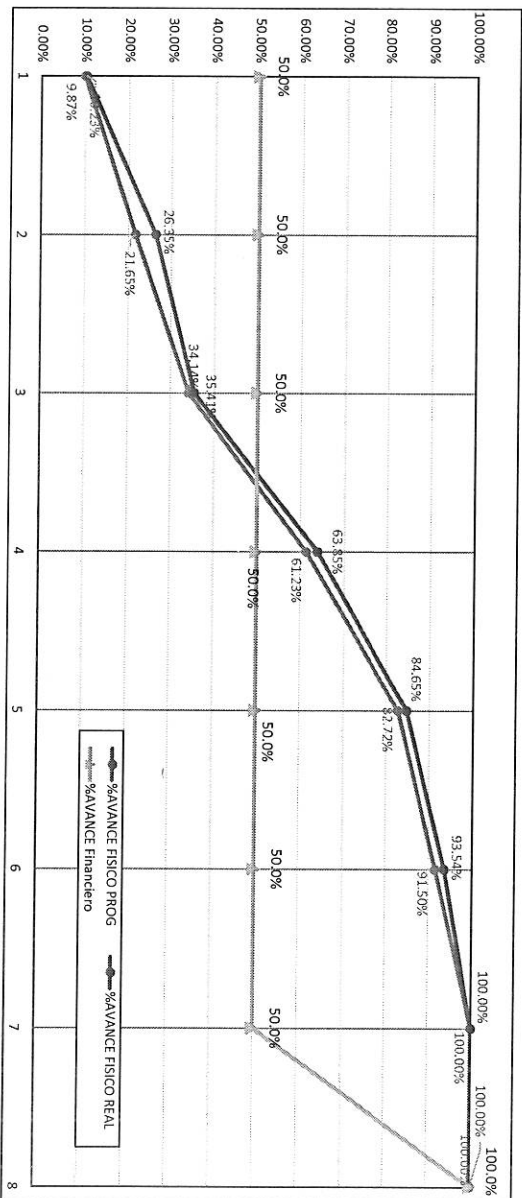

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
